

SUMÁRIO

1 OBJETIVO.....	4
2 ABRANGÊNCIA.....	4
3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4
4 TERMOS DE PARCERIA	4
5 EXECUÇÃO FÍSICA	6
6 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS.....	6
7 AUDITORIA INDEPENDENTE	6
8 CERTIDÕES NEGATIVAS.....	6
9 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	7
10 DISPOSIÇÕES FINAIS.....	7

ANEXOS:

- A - Relatórios Anuais de Execução de Atividades;
- B - Balanços Patrimoniais;
- C - Demonstrações dos Superávits ou Déficits (Resultados do Exercício);
- D - Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido;
- E - Demonstrações dos Fluxos de Caixa;
- F - Demonstrações do Valor Adicionado;
- G - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;
- H - Parecer e Relatório da Auditoria Independente;
- I - Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- J - Certificado de Regularidade do FGTS; e
- K - Extratos de Relatórios de Execução Física e Financeira.

1 OBJETIVO

Apresentação das atividades e das demonstrações financeiras de todos os Termos de Parceria celebrados, como comprovação da correta aplicação dos recursos repassados à CTCEA, vigentes no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025, respeitando os princípios fundamentais e as normas brasileiras de contabilidade.

2 ABRANGÊNCIA

- 2.1 Termo de Parceria nº 001/PAME-RJ/CTCEA/2020;
- 2.2 Termo de Parceria nº 21-EME-019-00//1/CCOMGEX/CTCEA/2021;
- 2.3 Termo de Parceria nº 002/CISCEA/2023;
- 2.4 Termo de Parceria nº 002/DECEA/CTCEA/2023; e
- 2.5 Administração Central.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA


- 3.1 Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999;
- 3.2 Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999;
- 3.3 Estatuto da CTCEA – Revisão 10.

4 TERMOS DE PARCERIA

Desde a sua criação, a CTCEA já assinou 20 (vinte) Termos de Parceria, dos quais 3 (três) com o Comando da Aeronáutica e 1 (um) com o Comando do Exército estão vigentes e contemplados neste relatório, conforme objetos abaixo relacionados.

- Termo de Parceria nº 001/PAME-RJ/CTCEA/2020:

O Termo de Parceria, assinado em 22/12/2020 e registrado na Plataforma Transferegov.br sob o nº 906702/2020, tem como objeto o desenvolvimento, a elaboração e a implementação de projetos de novos modelos produtivos e de sistemas alternativos de produção nas áreas de manutenção de equipamentos e sistemas, utilizados no controle do tráfego aéreo e na proteção ao voo, de suprimento técnico, de capacitação de pessoal e de impressão de publicações aeronáuticas, bem como a implementação de ações de logística sustentável e de promoção da preservação do meio ambiente, de forma a manter os níveis disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos de proteção ao voo e dos sistemas de tecnologia da informação operacional em

	Relatório de Atividades e das Demonstrações Financeiras Exercício 2025	RT068/26
--	---	----------

padrões internacionais, bem como aumentar a eficiência e eficácia dos processos de manutenção e de publicações aeronáuticas.

- Termo de Parceria nº 21-EME-019-00//1/CCOMGEX/CTCEA/2021:

O Termo de Parceria, assinado em 20/12/2021 e registrado na Plataforma Transferegov.br sob o nº 921393/2021, tem como objeto a cooperação técnica e especializada na gestão do Programa Estratégico do Exército – Sistema de Monitoramento de Fronteiras – SISFRON, mediante ações de colaboração, dentre outras, na gestão do ciclo de vida dos projetos, na elaboração dos novos requisitos dos sistemas e materiais, bem como nas fases de planejamento da contratação, seleção de empresas integradoras, empresas fornecedoras, gerenciamento e fiscalização de contratos administrativos e a formação de vínculo de cooperação, no intuito de, em parceria com a Administração Pública, efetivar a preparação e a promoção das medidas necessárias ao apoio à implantação das fases do Projeto SAD, em conformidade com a Estratégia Nacional de Defesa (END) e o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico e social do país, com reflexos diretos na defesa nacional, na proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Parceria.

- Termo de Parceria nº 002/CISCEA/2023:

O Termo de Parceria, assinado em 31/08/2023 e registrado na Plataforma Transferegov.br sob o nº 944500/2023, tem como objeto a execução de estudos e pesquisas para o desenvolvimento, disponibilização e a implementação de tecnologias, bem como, a gestão de projetos, no campo da navegação aérea, voltados à mobilidade de pessoas pelo modal aéreo, com significativos reflexos no desenvolvimento econômico e social do país, na preservação e proteção ao meio ambiente, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Parceria.

- Termo de Parceria nº 002/DECEA/CTCEA/2023:

O Termo de Parceria, assinado em 01/09/2023 e registrado na Plataforma Transferegov.br sob o nº 944518/2023, tem como objeto a realização de estudos, pesquisas, análises, implementação de tecnologias, proposições técnicas e administrativas, com a disponibilização de soluções para integrar projetos e áreas de interesse vinculados ao Sistema de Gestão de Tarifas de Navegação Aérea e aos aspectos econômicos e financeiros dos serviços providos pelo SISCEAB.

5 EXECUÇÃO FÍSICA

Os relatórios sobre a execução das atividades e projetos de todos os Termos de Parceria celebrados com a CTCEA, contendo o comparativo entre as metas previstas e os resultados alcançados, acordados com os Parceiros Públicos, vigentes no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025, estão apresentados como anexo A deste relatório.

6 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS

As demonstrações contábeis, ou seja, a apresentação estruturada da posição patrimonial e financeira da execução de todos os Termos de Parceria celebrados com a CTCEA, vigentes no período 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025, assim como, as notas explicativas destas demonstrações encontram-se nos anexos abaixo relacionados:

- B - Balanços Patrimoniais;
- C - Demonstrações dos Superávits ou Déficits (Resultados do Exercício);
- D - Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido;
- E - Demonstrações dos Fluxos de Caixa;
- F - Demonstrações do Valor Adicionado; e
- G - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.

7 AUDITORIA INDEPENDENTE

Os serviços de auditoria independente foram contratados em atendimento ao estabelecido no artigo nº 19, do Decreto nº 3.100, de 30 de julho de 1999, e, o parecer e relatório correspondente sobre as demonstrações contábeis de todos os Termos de Parceria celebrados vigentes com a CTCEA, período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025, está apresentado como anexo H deste relatório.

8 CERTIDÕES

A Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e o Certificado de Regularidade do FGTS, ambos emitidos pela internet, estão apresentados respectivamente como anexos I e J deste relatório.

9 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Os extratos de relatórios de execução física e financeira de todos os Termos de Parceria celebrados com a CTCEA, vigentes no período 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025, os quais deverão ser publicados no Diário Oficial da União até 60 (sessenta) dias após o término do exercício financeiro, em observância ao previsto no Decreto nº 3.100, de 30 de julho de 1999, estão apresentados como anexo K deste relatório.

10 DISPOSIÇÕES FINAIS

Este relatório de atividades e das demonstrações financeiras anual será publicado no site da CTCEA em observância às legislações vigentes regulamentadoras das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP.

SUMÁRIO

1	OBJETIVO	4
2	ABRANGÊNCIA	4
3	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4
4	GLOSSÁRIO	4
5	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	5
6	METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO	6
6.1	INDICADORES	6
7	EVOLUÇÃO DOS INDICADORES	7
8	CONCLUSÃO	7

ANEXO:

Anexo A – Execução Física do Exercício de 2025

1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar a execução física das atividades da CTCEA por meio do Termo de Parceria N° 001/CCOMGEX-CTCEA/2021 no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

2 ABRANGÊNCIA

- Termo de Parceria N° 001/CCOMGEX-CTCEA/2021.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Termo de Parceria n° 21-EME-019-00//001/CCOMGEX/CTCEA/2021;
- Lei n° 9790 de 23/03/1999;
- Decreto n° 3100 de 30/01/1999;
- 11º Relatório da Comissão de Avaliação – Período: 1º Quadrimestre de 2025, de 06 de junho de 2025;
- 12º Relatório da Comissão de Avaliação – Período: 2º Quadrimestre de 2025, de 23 de outubro de 2025;
- 13º Relatório da Comissão de Avaliação – Período: 2º Quadrimestre de 2025, de 27 de janeiro de 2026;
- RT396/25 - Relatório Gerencial de Avaliação de Desempenho TP001/CCOMGEX-CTCEA – Período: 1º Quadrimestre de 2025;
- RT694/25 - Relatório Gerencial de Avaliação de Desempenho TP001/CCOMGEX-CTCEA – Período: 2º Quadrimestre de 2025; e
- RT062/26 - Relatório Gerencial de Avaliação de Desempenho TP001/CCOMGEX-CTCEA – Período: 3º Quadrimestre de 2025.

4 GLOSSÁRIO

- **Termo de Parceria (TP)**

Conceito instituído pela Lei N° 9.790/99, de 23 de março de 1999 – Capítulo II – Art. 9º: “Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público”.

- **Termo de Ajuste**

Conceito instituído para reajustes de contrato, mediante simples apostilamento, considerando que não houve alteração no objeto, no preço final, e no prazo de execução pactuado.

- **Comissão de Avaliação**

Comissão composta por dois representantes do Parceiro Público e um da OSCIP. É incumbida de fiscalizar a execução das metas previstas no Programa de Trabalho, Anexo A do Termo de Parceria, de modo a estar em condições de avaliar a sua eficiência e efetividade, devendo propor ao Diretor do Termo de Parceria o redimensionamento e renegociação das atividades, através de um planejamento de recuperação, caso não estejam sendo alcançados os resultados esperados.

- **Parceiro Público**

Parceiro Público: é o Órgão do Poder Público, no caso CCOMGEX, com o qual é assinado o Termo de Parceria.

- **Programa de Trabalho**

Documento que vincula o Objeto do Termo de Parceria às metas, programas, projetos, atividades, recursos e a avaliação da Parceria.

- **Produtos, Contratos ou Atividades Adicionais**

São produtos, contratos, ou atividades adicionais não constantes no Programa de Trabalho, porém executados de comum acordo com o Parceiro Público no âmbito do Termo de Parceria.

- **Relatório de Acompanhamento de Execução Financeira e Orçamentária**

É o relatório que apresenta o desenvolvimento financeiro e orçamentário do Termo de Parceria, emitido mensalmente pela CTCEA.

5 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

O Termo de Parceria TP001/CCOMGEX-CTCEA/2021 foi assinado em 21/12/2021 com duração de 14 anos. Entretanto, as atividades da CTCEA, nas instalações do CCOMGEX iniciaram em 21/03/2022, data em que os empregados começaram a atuar efetivamente para implementar os programas e projetos previstos no Programa de Trabalho.

O quadro abaixo apresenta um resumo da execução física do Termo de Parceria expressa em Produtos.

Situação em dezembro de 2025	
Produtos do Termo de Parceria	7
Produtos do Extra Termo de Parceria	0
Produtos Concluídos	7
Produtos Cancelados	0
Produtos Não-Iniciados	0
Produtos Interrompidos	0
Produtos em Andamento	0

Quadro 1 – Situação dos Produtos

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

O Anexo B – Metodologia de Avaliação de Desempenho do Termo de Parceria N° 001/CCOMGEX-CTCEA/2021 estabelece a sistemática de avaliação de desempenho ao longo de toda execução do Programa de Trabalho do Termo de Parceria.

A parceria possui 3 (três) dimensões de avaliação que geram 3 (três) graus ou notas: o grau da **Avaliação Quantitativa (N1)**, o grau da **Avaliação da Qualidade (N2)**, e o grau da **Nota Geral (NG)**.

6.1 INDICADORES

A Nota Geral de Avaliação de Desempenho (NG) no quadrimestre será calculada com base na média ponderada das notas referentes à Avaliação Quantitativa (N1) e à Avaliação Qualitativa (N2), no quadrimestre em análise, de acordo com a seguinte fórmula:

$$NG = \frac{(N_1 \times 1) + (N_2 \times 2)}{3}$$

Onde:

N1: É a avaliação realizada por meio do acompanhamento da quantidade de produtos previstos versus os realizados no período avaliado, considerando os prazos acordados.

N2: É a avaliação realizada por meio de análise do atendimento dos resultados esperados. No caso, espera-se que a qualidade do trabalho realizado, em cada área do CCOMGEX em que a CTCEA atue, atenda às expectativas do Parceiro Público;

NG: É o resultado da avaliação quadrimestral realizada com base na média ponderada das notas atribuídas a Avaliação Quantitativa (N1) e a Avaliação Qualitativa (N2).

O resultado obtido será classificado da seguinte forma:

Atributo	Nota Atribuída (NG)
Satisfatório	$NG \geq 7$
Parcialmente Satisfatório	$4 \leq NG < 7$
Não Satisfatório	$NG < 4$

7 EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

O Quadro abaixo apresenta a evolução da entrega dos produtos e dos indicadores N1, N2 e NG do período de janeiro de 2025 a dezembro de 2025.

PERÍODO	PRODUTOS ENTREGUES	PRODUTOS PREVISTOS	PRODUTOS ANALISADOS PELA COMISSÃO	PRODUTOS ENTREGUES ACUMULADO	PRODUTOS PREVISTOS ACUMULADO	N1	N2	NG
JAN-ABR/2025	3	3	3	3	3	10	9,7	9,8
MAI-AGO/2025	2	2	2	5	5	10	9,8	9,8
SET-DEZ/2025	2	2	2	7	7	10	9,9	9,9

Quadro 2 – Evolução dos Indicadores do TP

Fontes:

- 11º Relatório da Comissão de Avaliação – Período: 1º Quadrimestre de 2025, de 06 de junho de 2025.
- 12º Relatório da Comissão de Avaliação – Período: 2º Quadrimestre de 2025, de 23 de outubro de 2025.
- 13º Relatório da Comissão de Avaliação – Período: 3º Quadrimestre de 2025, de 27 de janeiro de 2026.

8 CONCLUSÃO

Com base no conceito de avaliação estipulado no Termo de Parceria, e de acordo com as informações apresentadas no Quadro 2 – Evolução dos Indicadores do TP, temos:

No período de janeiro a dezembro de 2025

Todos os 7(sete) produtos previstos e relacionados com o período foram entregues nos prazos estabelecidos no Termo de Parceria.

Quadrimestre de janeiro a abril de 2025

Com base na metodologia de avaliação Quantitativa (N1), Qualitativa (N2) e a Nota Geral de Desempenho (NG) contabilizada pela Comissão de Avaliação e apresentada no 11º Relatório da Comissão de Avaliação, a CTCEA atingiu no período resultado satisfatório, conforme Quadro 2.

Quadrimestre de maio a agosto de 2025

Com base na metodologia de avaliação Quantitativa (N1), Qualitativa (N2) e a Nota Geral de Desempenho (NG) contabilizada pela Comissão de Avaliação e apresentada no 12º Relatório da Comissão de Avaliação, a CTCEA atingiu no período resultado satisfatório, conforme Quadro 2.

Quadrimestre de setembro a dezembro de 2025

Com base na metodologia de avaliação Quantitativa (N1), Qualitativa (N2) e a Nota Geral de Desempenho (NG) contabilizada pela Comissão de Avaliação e apresentada no 13º Relatório da Comissão de Avaliação, a CTCEA atingiu no período resultado satisfatório, conforme Quadro 2.

Cabe ressaltar, que a CTCEA cumpriu os prazos com assiduidade, confirmando a execução física em 100% do planejamento previsto.

Anexo A – Execução Física do Exercício de 2025

QUADR.	PERÍODO	PRODUTO	RT	CARTA	DATA
11°	Jan a Abr/25	Relatório da Situação Atual e Recomendações	RT033/25	CR006/25	08/01/25
		Relatório de Progresso dos Projetos de Apoio	RT355/25	CR121/25	09/05/25
		Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT352/25	CR120/25	09/05/25
12°	Mai a Ago/25	Relatório de Progresso dos Projetos de Apoio	RT650/25	CR241/25	08/09/25
		Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT651/25	CR242/25	08/09/25
13°	Set a Dez/25	Relatório de Progresso dos Projetos de Apoio	RT022/26	CR033/26	09/01/26
		Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT023/26	CR032/26	09/01/26

SUMÁRIO

1. OBJETIVO.....	3
2. ABRANGÊNCIA.....	3
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	3
4. EXECUÇÃO FÍSICA	3
5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO	4
6. CONCLUSÃO	7

ANEXOS:

A - REALIZAÇÃO FÍSICA - EXERCÍCIO 2025

1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar a execução física das atividades da CTCEA através do Termo de Parceria nº 001/ PAME-RJ/CTCEA/2020, no período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

2. ABRANGÊNCIA

Termo de Parceria n.º 001/PAME-RJ/CTCEA/2020.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Termo de Parceria n.º 001/ PAME-RJ/CTCEA /2020.

4. EXECUÇÃO FÍSICA

O Termo de Parceria n.º 001/ PAME-RJ/CTCEA/2020, iniciado em 06/01/2021, para a entrega de 225 produtos com prazo final de 05/01/2026, tendo como objetivos o desenvolvimento, a elaboração e a implementação de projeto para estudos, pesquisas e processos produtivos, voltados para o transporte aéreo, nas áreas de manutenção de equipamentos e sistemas, utilizados no controle do tráfego aéreo e na proteção ao voo, de suprimento técnico, de gestão da qualidade, de capacitação técnica e de impressão de publicações aeronáuticas, sendo que este último foi cancelado por ocasião do 3º Termo de Ajuste do TP Nº 001/PAME-RJ/CTCEA/2020, ocorrido em maio de 2024, conforme subitem 4.1 a seguir, bem como a implementação de ações de logística sustentável, de promoção da preservação do meio ambiente, e governança administrativa em conformidade com as metas, programas e projetos descritas no Plano de Trabalho.

4.1. PRODUTOS CANCELADOS

Foi registrado a interrupção do produto, Programa 1.3 (Gestão do Parque Gráfico do PAME-RJ) – Projeto 1.3.1, em virtude da realização do 3º Termo de Ajuste do TP Nº 001/PAME-RJ/CTCEA/2020, ocorrido em maio de 2024. Com isto a redução na entrega de produtos, a partir de JAN 2025 passou a ser de 218, uma vez que 07 produtos da Gráfica deixam de ser entregues. (São eles: 02 Relatórios trimestrais, (1.3.0.3) de MAI/AGO, SET/NOV do exercício de 2024, mais os 05 relatórios do exercício de 2025: 03 relatórios trimestrais (1.3.0.3) e 02 relatórios anuais (1.3.0.1 e 1.3.0.2)).

O quadro abaixo apresenta um resumo dos dados de execução física dos produtos do Termo de Parceria.

Situação	Jan 2025	Dez 2025
Produtos do TP	218	218
Produtos Extra TP	0	0
Produtos Concluídos	194	218
Produtos Cancelados	5	5
Produtos Não-Iniciados	0	0
Produtos Interrompidos	0	0
Produtos Em Andamento	0	8

O Anexo A que será mostrado a seguir, apresenta a listagem dos produtos concluídos nos exercícios de 2025.

5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

A Metodologia de Avaliação de Desempenho da Proposta do Termo de Parceria, define a sistemática de desempenho e avaliação na execução do Programa de Trabalho do Termo de Parceria, tanto para um período isolado, quanto para o Termo de Parceria como um todo.

A parceria possui 3 graus de avaliação: o grau da **Avaliação Quantitativa (N1)**, o grau da **Avaliação Qualitativa (N2)**, e o grau da **Nota Geral (NG)**.

5.1. INDICADORES

A Nota Geral de Avaliação de Desempenho (NG) no quadrimestre será calculada com base na média ponderada das notas referentes à Avaliação Quantitativa (N1) e à Avaliação Qualitativa (N2), no quadrimestre em análise, de acordo com a seguinte fórmula:

$$NG = \frac{(N_1 \times 1) + (N_2 \times 2)}{3}$$

Onde:

N1: Nota da Avaliação Quantitativa.

N2: Nota da Avaliação Qualitativa.

NG: Nota Geral da Avaliação de Desempenho do Quadrimestre.

O resultado obtido será classificado da seguinte forma:

Atributo	Nota Atribuída (NG)
Satisfatório	$NG \geq 7$
Parcialmente Satisfatório	$4 \leq NG < 7$
Não Satisfatório	$NG < 4$

5.2. EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Quadro 1: Tabela abaixo apresenta a evolução da entrega dos produtos e dos indicadores N1, N2 e NG.

PERÍODO	PRODUTOS ENTREGUES	PRODUTOS PREVISTOS	PRODUTOS ACEITOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO	PRODUTOS ENTREGUES ACUMULADOS	PRODUTOS PREVISTOS ACUMULADOS	N1	N2	NG
JAN-ABR/2021	27	27	27	27	27	10,0	10,0	10,0
MAI-AGO/2021	9	9	36	36	36	10,0	10,0	10,0
SET-DEZ/2021	27	27	63	63	63	10,0	10,0	10,0
JAN-ABR/2022	9	9	72	72	72	10,0	10,0	10,0
MAI-AGO/2022	9	9	81	81	81	10,0	10,0	10,0
SET-DEZ/2022	27	27	108	108	108	10,0	10,0	10,0
JAN-ABR/2023	9	9	117	117	117	10,0	10,0	10,0
MAI-AGO/2023	9	9	126	126	126	10,0	10,0	10,0
SET-DEZ/2023	27	27	153	153	153	10,0	10,0	10,0
JAN-ABR/2024	9	9	162	162	162	10,0	10,0	10,0
MAI-AGO/2024	8	8	170	170	170	10,0	10,0	10,0
SET-DEZ/2024	24	24	194	194	194	10,0	10,0	10,0
JAN-ABR/2025	8	8	202	202	202	10,0	10,0	10,0
MAI-AGO/2025	8	8	210	210	210	10,0	10,0	10,0
SET-DEZ/2025	8	8	-	218	218	-	-	-

6. CONCLUSÃO

Com base no conceito de avaliação estipulado no Termo de Parceria, e de acordo com os resultados detalhados conforme Quadro 1 - Evolução dos Indicadores do TP, temos:

Período de JAN-DEZ de 2025 – Todos os 24 produtos previstos e relacionados com o período foram entregues nos prazos contratuais estabelecidos.

Nos períodos de JAN-ABR/2025 e MAI-AGO/2025 temos:

- **Avaliação Quantitativa (N1) – 10,0.**
- **Avaliação Qualitativa (N2) – 10,0.**
- **Nota Geral de Avaliação de Desempenho (NG) – 10,0.**

De acordo com o item 5.1 – INDICADORES o desempenho do Termo de Parceria nos períodos de JAN-ABR/2025 e MAI-AGO/2025 é considerado como “**SATISFATÓRIO**”.

O aceite dos produtos entregues referente ao período de SET-DEZ/2025 e os resultados dos indicadores N1, N2 e NG serão consolidados durante a reunião da Comissão de Avaliação e registrados no Relatório da Comissão de Avaliação do Período de SET-DEZ/2025.

ANEXO A - EXECUÇÃO FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2025

8 PROGRAMAS		EVENTO	PRODUTO	RELATÓRIO	CARTA	DATA
1.1	Modernização dos Sistemas de Manutenção do PAME-RJ	1.1.0.1 2025	Relatório da Situação Atual e Recomendações	RT018/25	CR017/25	13/01/2025
1.1	Modernização dos Sistemas de Manutenção do PAME-RJ	1.1.0.2 2025	Programa de Execução e Identificação dos Projetos	RT019/25	CR017/25	13/01/2025
1.1	Modernização dos Sistemas de Manutenção do PAME-RJ	1.1.0.3 1Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT346/25	CR122/25	12/05/2025
1.1	Modernização dos Sistemas de Manutenção do PAME-RJ	1.1.0.3 2Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT638/25	CR231/25	11/09/2025
1.1	Modernização Sistemas de Manutenção do PAME-RJ	1.1.0.3 3Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT1039/26	CR001/26	06/01/2026
1.2	Modernização dos Sistemas de Monitoramento dos Equipamentos do SISCEAB	1.2.0.1 2025	Relatório da Situação Atual e Recomendações	RT023/25	CR018/25	13/01/2025
1.2	Modernização dos Sistemas de Monitoramento dos Equipamentos do SISCEAB	1.2.0.2 2025	Programa de Execução e Identificação dos Projetos	RT025/25	CR018/25	13/01/2025
1.2	Modernização dos Sistemas de Monitoramento dos Equipamentos do SISCEAB	1.2.0.3 1Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT363/25	CR123/25	12/05/2025
1.2	Modernização dos Sistemas de Monitoramento dos Equipamentos do SISCEAB	1.2.0.3 2Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT644/25	CR232/25	11/09/2025
1.2	Modernização dos Sistemas de Monitoramento dos Equipamentos do SISCEAB.	1.2.0.3 3Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT1036/26	CR002/26	06/01/2026
1.4	Modernização dos Sistemas Logística do PAME-RJ	1.4.0.1 2025	Relatório da Situação Atual e Recomendações	RT024/25	CR019/25	13/01/2025
1.4	Modernização dos Sistemas Logística do PAME-RJ	1.4.0.2 2025	Programa de Execução e Identificação dos Projetos	RT026/25	CR019/25	13/01/2025
1.4	Modernização dos Sistemas Logística do PAME-RJ	1.4.0.3 1Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT362/25	CR124/25	12/05/2025
1.4	Modernização dos Sistemas Logística do PAME-RJ	1.4.0.3 2Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT645/25	CR233/25	11/09/2025
1.4	Modernização dos Sistemas Logística do PAME-RJ	1.4.0.3 3Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT1037/26	CR003/26	06/01/2026

2.1	Qualidade	2.1.0.1 2025	Relatório da Situação Atual e Recomendações	RT055/25	CR020/25	13/01/2025
2.1	Qualidade	2.1.0.2 2025	Programa de Execução e Identificação dos Projetos	RT050/25	CR020/25	13/01/2025
2.1	Qualidade	2.1.0.3 1Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT360/25	CR125/25	12/05/2025
2.1	Qualidade	2.1.0.3 2Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT637/25	CR234/25	11/09/2025
2.1	Qualidade	2.1.0.3 3Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT1040/26	CR004/26	06/01/2026
2.2	Segurança do Trabalho	2.2.0.1 2025	Relatório da Situação Atual e Recomendações	RT056/25	CR021/25	13/01/2025
2.2	Segurança do Trabalho	2.2.0.2 2025	Programa de Execução e Identificação dos Projetos	RT051/25	CR021/25	13/01/2025
2.2	Segurança do Trabalho	2.2.0.3 1Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT359/25	CR126/25	12/05/2025
2.2	Segurança do Trabalho	2.2.0.3 2Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT639/25	CR235/25	11/09/2025
2.2	Segurança do Trabalho	2.2.0.3 3Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT1041/26	CR005/26	06/01/2026
2.3	Sustentabilidade e Meio Ambiente	2.3.0.1 2025	Relatório da Situação Atual e Recomendações	RT057/25	CR022/25	13/01/2025
2.3	Sustentabilidade e Meio Ambiente	2.3.0.2 2025	Programa de Execução e Identificação dos Projetos	RT052/25	CR022/25	13/01/2025
2.3	Sustentabilidade e Meio Ambiente	2.3.0.3 1Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT358/25	CR127/25	12/05/2025
2.3	Sustentabilidade e Meio Ambiente	2.3.0.3 2Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT640/25	CR236/25	11/09/2025
2.3	Sustentabilidade e Meio Ambiente	2.3.0.3 3Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT1042/26	CR006/26	06/01/2026
2.4	Capacitação	2.4.0.1 2025	Relatório da Situação Atual e Recomendações	RT058/25	CR023/25	13/01/2025

2.4	Capacitação	2.4.0.2 2025	Programa de Execução e Identificação dos Projetos	RT053/25	CR023/25	13/01/2025
2.4	Capacitação	2.4.0.3 1Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT357/25	CR128/25	12/05/2025
2.4	Capacitação	2.4.0.3 2Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT641/25	CR237/25	11/09/2025
2.4	Capacitação	2.4.0.3 3Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT1043/26	CR007/26	06/01/2026
2.5	Governança	2.5.0.1 2025	Relatório da Situação Atual e Recomendações	RT059/25	CR024/25	13/01/2025
2.5	Governança	2.5.0.2 2025	Programa de Execução e Identificação dos Projetos	RT054/25	CR024/25	13/01/2025
2.5	Governança	2.5.0.3 1Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT356/25	CR129/25	12/05/2025
2.5	Governança	2.5.0.3 2Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT642/25	CR238/25	11/09/2025
2.5	Governança	2.5.0.3 3Q 2025	Relatório de Execução dos Projetos e Atividades	RT1044/26	CR008/26	06/01/2026

SUMÁRIO


1 OBJETIVO	4
2 ABRANGÊNCIA.....	4
3 CONCEITUAÇÕES E SIGLAS	4
4 CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	7
5 O PROGRAMA DE TRABALHO	8
6 DESEMPENHO QUANTITATIVO EFETIVO	23
7 CONCLUSÃO	24

ANEXOS:

A – PROJETOS DO PROGRAMA DE TRABALHO 2025

GRÁFICOS:

- 1 – Visão Geral dos Projetos do Programa de Trabalho 2025
- 2 – Ciclo de Vida dos Projetos
- 3 – Desempenho Quantitativo Efetivo (IQPE %)
- 4 – Média do IQPE por Quadrimestre
- 5 – Média do IQPE por Divisão/Seção

	RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - 2025 TERMO DE PARCERIA Nº 002/CISCEA/2023	RT085/26
---	--	----------

1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar o resultado alcançado, pela CTCEA, no que se refere à execução física dos projetos relacionados ao Termo de Parceria nº 002/CISCEA/2023, no período compreendido entre os meses de janeiro e dezembro de 2025.


2 ABRANGÊNCIA

- 2.1 Termo de Parceria nº 002/CISCEA/2023 e seus Anexos;
- 2.2 Relatório Gerencial Janeiro a Abril de 2025 – RT408/25 Rev. 00, de 29 de maio de 2025;
- 2.3 Relatório Gerencial Maio a Agosto de 2025 – RT701/25 Rev. 01, de 06 de novembro de 2025; e
- 2.4 Relatório Gerencial Setembro a Dezembro de 2025 – RT052/26, de 21 de janeiro de 2026.

3 CONCEITUAÇÕES E SIGLAS

Para melhor compreensão dos resultados demonstrados, apresentam-se as conceituações e siglas utilizadas neste relatório, em conformidade com o Termo de Parceria nº 002/CISCEA/2023 e seus anexos:

- 3.1 **ACC-AO:** Centro de Controle de Área do Atlântico.
- 3.2 **ACC-CW:** Centro de Controle de Área de Curitiba.
- 3.3 **AFIS (Aerodrome Flight Information Service):** Serviço de Informação de Voo de Aeródromo, um serviço essencial em aeroportos menores (sem torre de controle ATC), que fornece avisos e informações cruciais (clima, tráfego, pista) para a operação segura e eficiente de voos.
- 3.4 **AGMA:** Assessoria em Meio Ambiente.
- 3.5 **APP:** Centro de Controle de Aproximação.
- 3.6 **ATIVIDADE:** conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesse da CISCEA, conforme previsto no Termo de Parceria.
- 3.7 **ATN-BR:** Rede de Telecomunicações Aeronáuticas do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro.
- 3.8 **AVALIAÇÃO QUANTITATIVA:** avaliação realizada por meio do acompanhamento da quantidade de produtos previstos em um quadrimestre, em relação aos produtos efetivamente executados (entregues), considerando-se os prazos acordados.
- 3.9 **CGTEC:** Centro de Gerenciamento Técnico.
- 3.10 **CINDACTA:** Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo.
- 3.11 **CISCEA:** Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo.
- 3.12 **CRCEA-SE:** Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste.
- 3.13 **CTCEA:** Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Controle do Espaço Aéreo.

	RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - 2025 TERMO DE PARCERIA Nº 002/CISCEA/2023	RT085/26
---	--	----------

3.14 CODEX.: Código de Execução – numeração única que designa um projeto, conforme necessidade interna da Organização Militar, possibilitando distinguir vários projetos que podem compartilhar o mesmo CODFIN.

3.15 CODFIN: Código da Ficha de Informação de Necessidades – é a codificação atribuída a uma Ficha de Informação de Necessidades (FIN), após sua aprovação. São registradas na FIN e, conseqüentemente no CODFIN, as necessidades de projetos e atividades das Organizações Militares, com vistas à formação de um banco de dados para o Planejamento Setorial (PLANSET) e para os Programas de Trabalho Anuais (PTA). O CODFIN acompanha o projeto em todo seu ciclo de vida e nele estão estabelecidos os requisitos iniciais do projeto, assim como justificativa, prioridade e as fases de planejamentos físico e financeiro ao longo da execução do projeto. O CODFIN é composto por 3 (três) letras, que correspondem aos macroprocessos (setores de atuação do DECEA), 2 (dois) dígitos, que correspondem aos sistemas, e 3 (três) dígitos, que representam a sequência cronológica da atividade ou projeto. Ex: MET02012.

3.16 COMAER: Comando da Aeronáutica.

3.17 DECEA: Departamento de Controle do Espaço Aéreo.

3.18 DME: Distance Measuring Equipment. Estações DME são pontos terrestres de radionavegação aérea que medem a distância (em milhas náuticas) entre a aeronave e a estação, usando pulsos de rádio, fornecendo dados cruciais para navegação de precisão.

3.19 DTCEA: Destacamento de Controle do Espaço Aéreo.

3.20 DTINFRA-RJ: Destacamento de Infraestrutura da Aeronáutica do Rio de Janeiro.

3.21 DVOR: Doppler VHF Omn Directional Range é um sistema de auxílio à navegação por rádio para aeronaves, uma evolução do VOR que usa o efeito Doppler para maior precisão em determinar a direção e posição de uma aeronave em relação à estação terrestre.

3.22 EMS-A: Estação Meteorológica de Superfície Automática é um sistema de alta tecnologia que coleta e transmite dados meteorológicos em tempo real (vento, temperatura, visibilidade etc.) para pilotos e controladores, aumentando a segurança das operações de pouso e decolagem.

3.23 GAP-RJ: Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro.

3.24 GT: Grupo de Trabalho.


3.25 HF: Do inglês “High Frequency”. Significa alta frequência e refere-se a uma faixa de espectro eletromagnético (3 a 30 MHz), usada em rádio para comunicação de longa distância.

3.26 ICAO: Sigla em inglês para Organização da Aviação Civil Internacional.

3.27 ICEA: Instituto de Controle do Espaço Aéreo.

3.28 IDP: Índice de Desempenho de Projeto.

3.29 ILS CAT I: Instrument Landing System Categoria 1 é o tipo mais comum de sistema de pouso por instrumentos, permitindo pousos seguros em visibilidade reduzida, guiando a aeronave com precisão até perto do solo, mesmo sem contato visual direto com a pista.

	RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - 2025 TERMO DE PARCERIA Nº 002/CISCEA/2023	RT085/26
---	--	----------

3.30 IQPE(%): Indicador Quantitativo de Produtividade Efetiva - relação entre IQPR (%) e IQPD (%), indicando o bom andamento do projeto ($IQPE=(IQPR/IQPD)\times 100$).

3.31 IQPD(%): Indicador Quantitativo de Produtividade Desejada - percentual de realização esperado para um projeto em um período.

3.32 IQPR(%): Indicador Quantitativo de Produtividade Realizada - percentual efetivamente realizado pela CTCEA na gestão de um projeto.

3.33 META: Trata-se de um objetivo almejado que pode ser mensurado e claramente definido. A Meta é definida pelo conjunto de projetos, atividades e produtos realizados.

3.34 MIQP (%): Média do Indicador Quantitativo de Produtividade - média dos IQPE (%) dos projetos, avaliando o bom andamento da Meta.

3.35 NOP: Necessidade Operacional. Documento no qual é registrada uma carência ou deficiência constatada, cuja superação para cabal desempenho da missão do Comando da Aeronáutica, depende fornecimento de um novo sistema ou material ou de modificações de um já existente.

3.36 OM: Organização Militar.

3.37 OSCIP: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

3.38 PAR (Precision Approach Radar) Móvel: Radar de aproximação de precisão em sua versão móvel, usado para guiar pilotos em pousos precisos, especialmente em operações militares ou aeródromos temporários, fornecendo dados de distância, alinhamento lateral e ângulo de planeio, crucial para pousos seguros em visibilidade reduzida.

3.39 PLANSET: Plano Setorial do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

3.40 PRODUTO: é o resultado de um determinado processo. Não existe um produto ou serviço sem que haja um processo.


3.41 PROGRAMA DE TRABALHO: documento previsto na Lei nº 9.790/99 e no Decreto Lei nº 3.100/99, que descreve a meta, os projetos, os produtos e as atividades, com detalhamento suficiente para possibilitar a avaliação plena do objetivo da parceria, com os seus benefícios, custos e prazos;

3.42 PROJETO: é um conjunto de ações, documentos, atividades, processos e produtos que se destinam ao atingimento da Meta.

3.43 RELATÓRIO GERENCIAL: documento obrigatório a ser apresentado, periodicamente, conforme acordado na parceria, de modo a comprovar a execução física e financeira, bem como os benefícios alcançados.

3.44 RTLI: Requisitos Técnicos, Logísticos e Industriais Preliminares.

3.45 SAGITARIO: Sistema Avançado de Gerenciamento de Informações de Tráfego Aéreo e Relatório de Interesse Operacional.

	RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - 2025 TERMO DE PARCERIA Nº 002/CISCEA/2023	RT085/26
---	--	----------

3.46 SELCAL 32: O SELCAL (Selective Calling) é um sistema de rádio usado na aviação para chamar seletivamente uma aeronave específica, permitindo que a tripulação não precise monitorar constantemente as frequências de rádio, recebendo um alerta sonoro ou visual quando uma comunicação é direcionada a ela.

3.47 SIGA: Sistema Integrado de Gestão Administrativa – ferramenta de Tecnologia de Informação (TI) disponibilizada pela CISCEA, que realiza o planejamento, o acompanhamento e o controle da execução física das atividades e projetos.

3.48 SIGAD: Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos.

3.49 SISCEAB: Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro.

3.50 SISCOD: Sistema de Codificação de Documentos.

3.51 SISGTEC: Sistema de Gerenciamento Técnico do SISCEAB.

3.52 STVD: Sistema de Tratamento e Visualização de Dados.

3.53 TATIC AFIS: Sistema da Solução TATIC® Suite específico para estações AFIS baseado no uso de strips eletrônicas, tendo como principais finalidades o auxílio ao operador da estação na organização do tráfego aéreo local, o armazenamento de informações operacionais relevantes para uso local ou global e, por fim, a integração de dados com sistemas próprios ou de terceiros para auxiliar na tomada de decisões colaborativas.

3.54 TMA: Do inglês *Terminal Control Area* (Área de Controle Terminal).

3.55 TRD: Termo de Recebimento Definitivo.

3.56 TWR: Do inglês *tower* (torre).

3.57 VHF-AM: *Very High Frequency – Amplitude Modelada* é um Sistema de radiocomunicação de voz essencial na aviação, usado para comunicação terra-ar entre pilotos e controladores de tráfego aéreo, permitindo operações seguras entre aeroportos e rotas.

3.58 VPE: Seção de Planejamento Estratégico.

3.59 VSAT: *Very Small Aperture Terminal* é uma tecnologia de comunicação via satélite com antenas parabólicas pequenas, que oferece acesso à internet, voz e vídeo para locais remotos ou com infraestrutura deficiente, usando satélites geoestacionários para conectar terminais (antenas) a um HUB central.

3.60 VTI: Centro de Tecnologia da Informação.

4 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Iniciado em setembro de 2023, o Termo de Parceria 002/CISCEA/2023 tem por objetivo o estabelecimento de vínculo de cooperação para a execução de estudos e pesquisas para o desenvolvimento, disponibilização e implementação de tecnologias, bem como a gestão de projetos, no campo da navegação aérea, voltados à mobilidade de pessoas pelo modal aéreo, com significativos reflexos no desenvolvimento econômico e social do país, na preservação e proteção ao meio ambiente.

O Programa de Trabalho foi estruturado para atendimento à Meta Única, relacionada às funcionalidades do SISCEAB, visando a execução de seu objetivo ao longo de 5 (cinco) anos.

A partir do início da execução da então mencionada Parceria, os partícipes definem o Programa de Trabalho a ser cumprido, em cada quadrimestre, estabelecendo os produtos a serem executados no período. Ao fim de cada período quadrimestral, os resultados efetivamente alcançados são processados no SIGA, apresentados no presente relatório e submetidos à Comissão de Avaliação, para análise e mensuração do desempenho.

5 O PROGRAMA DE TRABALHO

5.1 A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Os Ofícios constantes nos relatórios gerenciais citados anteriormente definiram o Programa de Trabalho do período, particionado em 3 (três) quadrimestres, compreendendo o gerenciamento total de 170 (cento e setenta) projetos relacionados às funcionalidades do SISCEAB e ao cumprimento do objeto do Termo de Parceria ao longo do ano de 2025.

O gráfico a seguir representa o cenário no qual 26 (vinte e seis) projetos foram concluídos, 12 (doze) projetos foram interrompidos/cancelados e 132 projetos permaneceram em execução no decorrer do ano, tendo estes últimos transitado para o período de janeiro a dezembro de 2026.

VISÃO GERAL DO PROGRAMA DE TRABALHO

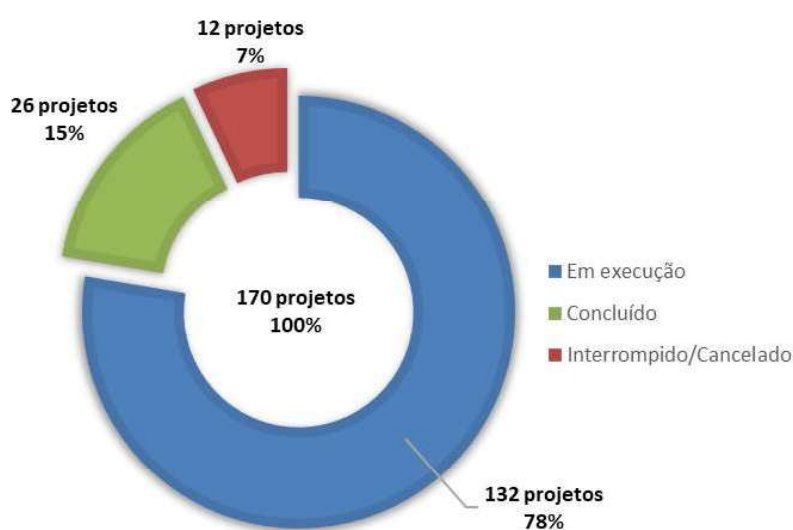



Gráfico 1 – Visão Geral dos Projetos do Programa de Trabalho 2025

5.1.1 PROJETOS CONCLUÍDOS

Os 26 (vinte e seis) projetos listados a seguir foram concluídos no período de janeiro a dezembro de 2025, consolidando o compromisso da parceria com a evolução do SISCEAB e culminando em avanços significativos na modernização da infraestrutura e no fortalecimento da segurança e eficiência da navegação aérea brasileira.

	RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - 2025 TERMO DE PARCERIA Nº 002/CISCEA/2023	RT085/26
---	--	----------

→ Os projetos que seguem foram concluídos no período de janeiro a abril de 2025.

- **14.039 – Gerenciar a Implantação da Nova Sede do 5º/1º GCC em Porto Velho**
 - OPM07003 – Transferir o 5º/1º GCC para Porto Velho
 - Localidades: Porto Velho.
 - Data prevista para conclusão: 21/03/2025
 - Data real de conclusão: 26/03/2025
- **18.024 – Implantar DVOR/DME em Tabatinga (PFF012)**
 - NAV03005 – Implantar DVOR/DME
 - Localidades: Tabatinga.
 - Data prevista para conclusão: 28/12/2024
 - Data real de conclusão: 14/04/2025
- **19.014 – Implantar DVOR/DME em Campinas**
 - NAV03023 – Implantar DVOR/DME
 - Localidades: Campinas.
 - Data prevista para conclusão: 10/01/2025
 - Data real de conclusão: 14/04/2025
- **19.030 – Ampliar a Capacidade de Armazenamento dos Tanques de Óleo Diesel dos Grupos Geradores da Casa de Força do ICEA (Sede)**
 - LOG04293 – Ampliar a Capacidade de Armazenamento dos Tanques de Óleo Diesel dos Grupos Geradores da Casa de Força do ICEA (Sede)
 - Localidades: São José dos Campos.
 - Data prevista para conclusão: 03/04/2025
 - Data real de conclusão: 03/04/2025
- **21.004 – Implantar Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica – CIMAER – Instalações Administrativas**
 - MET99012 – Implantar Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica – CIMAER
 - Localidades: Rio de Janeiro.
 - Data prevista para conclusão: 08/04/2025
 - Data real de conclusão: 08/04/2025
- **PLS.CISCEA – Implantar Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) no Âmbito da CISCEA**
 - RHU99016 – Atender Ações Relativas ao Planejamento e Gestão da Área de Meio Ambiente e Sustentabilidade a serem Desenvolvidos no Âmbito do DECEA e OM Subordinadas
 - Localidades: Rio de Janeiro.
 - Data prevista para conclusão: 28/02/2025
 - Data real de conclusão: 26/02/2025

→ Os projetos que seguem foram concluídos no período de maio a agosto de 2025.

• **10.005 (b) – Implantar Rede ATN-BR (Fase 3)**

- TEL02004 – Implantar Rede de Comunicações do COMAER no CINDACTA II, CINDACTA III e CRCEA-SE – Rede ATN-BR
- Localidades: Canguçu, Santiago; Mossoró; Ponta Porã; Santa Maria; Natal; Curitiba; SRPV-SP; Jaraguari; Salvador; Cratéus; Recife; Bonito; Fortaleza; Fernando de Noronha; Morro do Urucum; Juazeiro do Norte; Paranaíba; Santos; DTCEATM-RJ; Canoas; Corrente; Porto Alegre; Porto Murtinho; Guarapuava; Aracaju; Bom Jesus da Lapa; Passo Fundo; Morro da Igreja; Coxim; Assis; São Francisco do Sul; Patos; Ilhéus; Teresina; Floriano; Florianópolis; Vitória da Conquista; Navegantes; São Raimundo Nonato; Porto Seguro; Barreiras; Campo Grande; Paulo Afonso; Loanda; Três Lagoas; Petrolina; Foz do Iguazu; Catanduvas; Maceió.
- Data prevista para conclusão: 24/06/2025
- Data real de conclusão: 20/08/2025

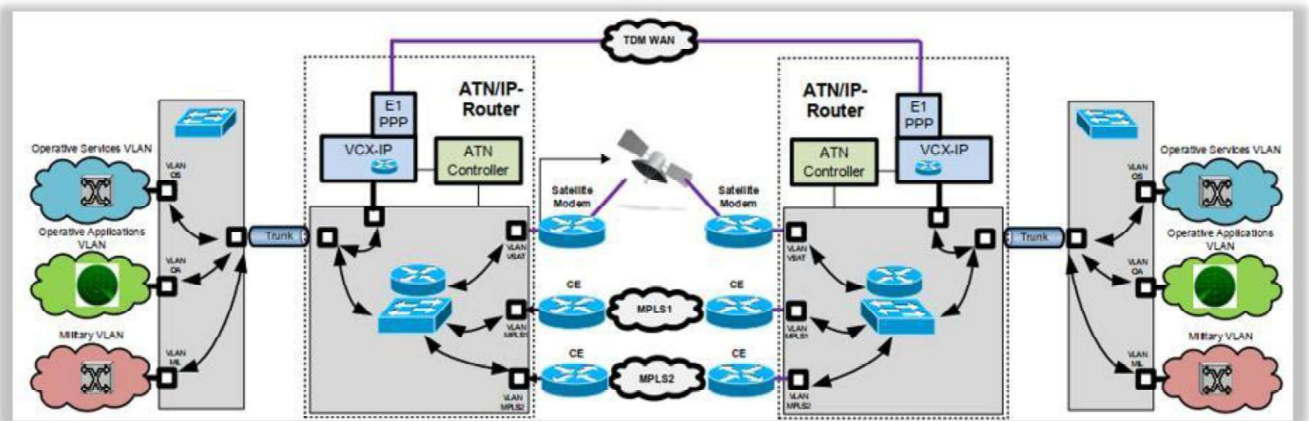


Imagem 1 – Fotos ilustrativas referentes ao ATN-BR

• **10.005 (c) – Implantar Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Backbone de Comunicação Operacional (PFF042)**

- TEL02004 – Implantar Rede de Comunicações do COMAER no CINDACTA II, CINDACTA III e CRCEA-SE – Rede ATN-BR

- Localidades: Brasília; Manaus; Curitiba; São José dos Campos; Rio de Janeiro; Congonhas; Recife.
- Data prevista para conclusão: 05/05/2025
- Data real de conclusão: 20/08/2025
- **19.020 – Implantar SIGTEC 2 (PFF009)**
 - TEL99037 – Ampliar os Limites e Funcionalidades Contratadas para a Ferramenta SIGTEC (POC com Sistemas com Suporte SNMP da TMA-RJ) criando condições para permitir ao CGTEC o Monitoramento dos Principais Sistemas do SISCEAB
 - Localidades: Rio de Janeiro.
 - Data prevista para conclusão: 16/07/2025
 - Data real de conclusão: 20/08/2025
- **20.017 – Substituir Sistema de Luzes de Aproximação – Anápolis**
 - NAV04021 – Substituir Sistema de Luzes de Aproximação
 - Localidades: Anápolis.
 - Data prevista para conclusão: 25/07/2025
 - Data real de conclusão: 05/08/2025

**Antes****Depois**

Imagem 2 – Fotos ilustrativas referentes às luzes de aproximação

- **20.018 – Substituir Sistema de Luzes de Aproximação de Canoas**
 - NAV99004 – Substituir Sistema de Luzes de Aproximação
 - Localidades: Canoas.
 - Data prevista para conclusão: 26/09/2025
 - Data real de conclusão: 05/08/2025
- **20.019 – Substituir Sistema de Luzes de Aproximação de Santa Maria**
 - NAV99008 – Substituir Sistema de Luzes de Aproximação
 - Localidades: Santa Maria.
 - Data prevista para conclusão: 22/08/2025
 - Data real de conclusão: 05/08/2025
- **22.012 – Substituir LOC do Aeroporto de Porto Alegre (PFF012)**

- NAV04031 – Substituir LOC do Aeroporto de Porto Alegre
- Localidades: Porto Alegre.
- Data prevista para conclusão: 05/05/2025
- Data real de conclusão: 22/08/2025
- **23.007 – Implantar TATIC TWR (+Módulo APP)**
 - ATM99056 – Implantar TATIC TWR (Módulo APP)
 - Localidades: Presidente Prudente; Jacarepaguá; Teresina; Uberlândia; Santarém; Macapá; Uberaba; Londrina; Palmas; Ribeirão Preto.
 - Data prevista para conclusão: 05/05/2025
 - Data real de conclusão: 13/06/2025
- **23.025 – Implementar Sistema Crítico de Energia Dualizado na DIVOC em Apoio ao SISCEAB (alimentação da DIVOC pela KF do CINDACTA I)**
 - LOG99046 – Implantar Sistema Crítico de Energia Elétrica da DIVOC Através da KF do CINDACTA I
 - Localidades: Brasília.
 - Data prevista para conclusão: 29/07/2025
 - Data real de conclusão: 15/07/2025
- **24.013 – Implantar o Processo de Automatização de Produção de Cartas VFR e Criação de Banco de Dados SIG (PFF017)**
 - CAR04033 – Adquirir Licenças da Plataforma ARCGIS
 - Localidades: Rio de Janeiro.
 - Data prevista para conclusão: 05/05/2025
 - Data real de conclusão: 08/05/2025



Imagem 3 – Fotos ilustrativas referentes ao sistema ArcGIS

→ Os projetos que seguem foram concluídos no período de setembro a dezembro de 2025.

- **17.014 – Implantar 33 Estações DME**

- NAV03016 – Implantar Estações DME
- Localidades: Porto De Galinhas, Vitória De Santo Antão, Ilhéus, Ponta Grossa, Caruaru, Igarassú, Jaraguá, Taquara, Jequié, Maragogipe, Biguaçu, Diamantina, Campo Largo, Taquari, Lapa-Sp, Alagoinhas, Teófilo Otoni, Curvelo, Caldas Novas, Registro, Itajaí, Alto Paraíso De Goiás, Ingleses, Morro De São Paulo, Colombo, Pará De Minas, Juazeiro Do Norte, Paulo Afonso, Gurupi, Lajes, Paranaguá, João Pessoa, Sete Lagoas.
- Data prevista para conclusão: 14/09/2025
- Data real de conclusão: 08/10/2025



Imagem 4 – Fotos ilustrativas de uma das 33 estação DME

- **19.009 – Substituir ILS CAT I – Brasília (PFF012)**

- NAV04014 – Substituir ILS CAT I
- Localidades: Brasília
- Data prevista para conclusão: 04/10/2025
- Data real de conclusão: 10/12/2025



Imagem 5 – Fotos do ILS CAT I - Brasília

• 19.028 – Implantar 16 Estações DME

- NAV03016 – Implantar Estações DME
- Localidades: Guajará-Mirim, Lábrea, Surucucu, Altamira, Conceição Do Araguaia, Tarauacá, Barcelos, Porto Esperidião, Ji-Paraná, Canarana, Aripuanã, Porto Alegre Do Norte, Sorriso, Tangará Da Serra, Eirunepé, Carauari
- Data prevista para conclusão: 26/09/2025
- Data real de conclusão: 15/12/2025



Imagem 6 – Fotos ilustrativas de uma das 16 Estações DME

• 19.051 – Implantar Radar Meteorológico em Rio Branco

- MET05010 – Implantar Radares Meteorológicos
- Localidades: Rio Branco
- Data prevista para conclusão: 03/10/2025
- Data real de conclusão: 15/12/2025



Imagem 7 – Fotos do radar meteorológico de Rio Branco

- **20.010 – Substituir Radar Meteorológico em Belém**

- MET05010 – Implantar Radares Meteorológicos
- Localidades: Belém
- Data prevista para conclusão: 18/12/2025
- Data real de conclusão: 16/12/2025



Imagem 8 – Fotos do radar meteorológico de Belém

- **20.011 – Implantar DVOR/DME em Bacacheri-PR (PFF012)**

- NAV03019 – Implantar DVOR/DME em Bacacheri-PR
- Localidades: Bacacheri
- Data prevista para conclusão: 20/12/2025
- Data real de conclusão: 30/12/2025



Imagem 9 – Fotos do DVOR/DME de Bacacheri

- **20.027 – Implantar EMS-A em 8 Aeroportos Regionais (SAC)**

- MET07048 – Implantar Estações Meteorológicas de Superfície de Interesse da SAC
- Localidades: Diversas
- Data prevista para conclusão: 06/11/2025
- Data real de conclusão: 04/12/2025



Imagem 10 – Fotos ilustrativas de uma das EMS-A instaladas

- **20.031 – Implantar ATN-Br (VSAT) na Região do CRCEA-SE**

- TEL02012 – Implantar ATN-Br (VSAT) na Região do CRCEA-SE
- Localidades: Diversas
- Data prevista para conclusão: 05/10/2025
- Data real de conclusão: 06/10/2025

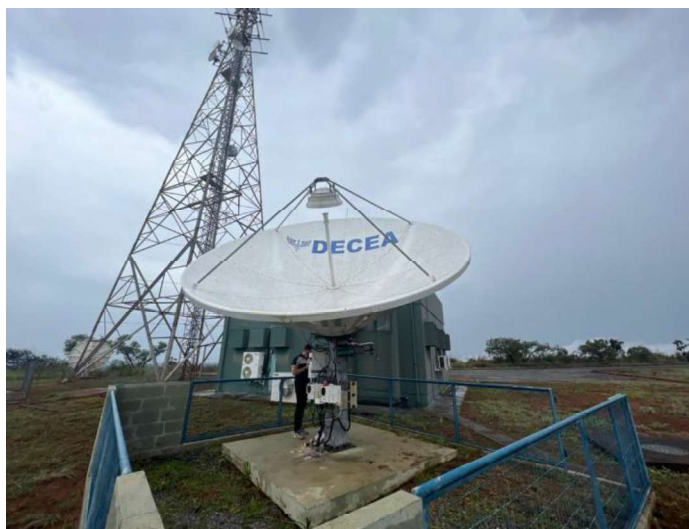


Imagem 11 – Fotos ilustrativas ATN-Br (VSAT)

- **21.031 – Implantar Rede de Dutos em Navegantes (PFF010)**

- TEL03033 – Implantar Estação VHF-AM Park Air em Navegantes
- Localidades: Navegantes
- Data prevista para conclusão: 12/12/2025
- Data real de conclusão: 23/12/2025



Imagem 12 – Fotos das caixas de passagem da rede de dutos em Navegantes

- **21.036 – Atualizar Hardware do STVD SAGITARIO do ACC-AO**

- LOG10004 – Atualizar Hardware do STVD SAGITARIO do ACC-AO
- Localidades: Recife
- Data prevista para conclusão: 12/09/2025
- Data real de conclusão: 25/09/2025

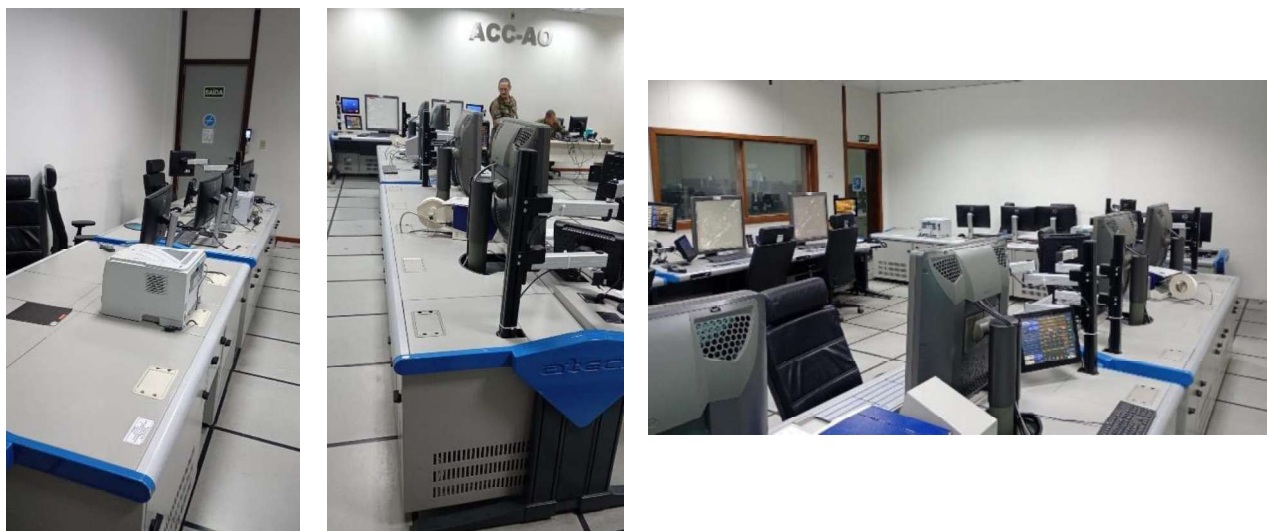


Imagem 13 – Fotos dos hardwares instalados no ACC-AO

Cabe ressaltar que, de acordo com o Programa de Trabalho estabelecido para o período de setembro a dezembro de 2025, a previsão era para conclusão de 11 (onze) projetos, porém o projeto 19.039 (LOG10015) não pôde ser encerrado e permanece em execução, conforme justificativas demonstradas abaixo.


- **19.039 – Atualizar Hardware do STVD SAGITARIO do ACC-CW**
 - LOG10015 – Atualizar Hardware do STVD SAGITARIO do ACC-CW
 - Localidades: Curitiba
 - Data prevista para conclusão: 18/12/2025
 - Justificativa: O projeto não pôde ser concluído e permanece em execução, pois a Divisão Operacional está aguardando a assinatura do Termo de Entrega pelo sítio, para posterior emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

5.1.2 PROJETOS INTERROMPIDOS OU CANCELADOS

Durante o ano de 2025, 12 (doze) projetos foram interrompidos ou cancelados, por orientação do Parceiro Público, de acordo com as justificativas demonstradas abaixo.

→ Os projetos que seguem foram interrompidos ou cancelados no período de janeiro a abril de 2025.

- **24.018 – Modernizar Infraestrutura do STVD SAGITARIO do APP-FZ**
 - LOG10061 – Modernizar Infraestrutura STVD APP (Diagonal de Modernização)
 - Status: Cancelado
 - Localidades: Fortaleza
 - Data prevista para conclusão: 10/11/2028
 - Justificativas para interrupção/cancelamento: RAJU 047/2024 assinada em 13/JUN/2024, mas a contratação do STVD5 foi postergada para JUNHO/2025, em função da necessidade

	RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - 2025 TERMO DE PARCERIA Nº 002/CISCEA/2023	RT085/26
---	--	----------

de realizar novas cotações para os valores de Hardware que serão empregados no STVD4, APP Nordeste e no próprio STVD5.

- **24.019 – Modernizar Infraestrutura do STVD SAGITARIO do APP-LO**

 - LOG10061 – Modernizar Infraestrutura STVD APP (Diagonal de Modernização)
 - Status: Cancelado
 - Localidades: Londrina
 - Data prevista para conclusão: 17/12/2027
 - Justificativa para interrupção/cancelamento: Cancelamento de rede em função da orientação do SDTE de suspender os investimentos em sistemas de Tecnologia de Informática Operacional (TIOP) instalados e mantidos pela Nav Brasil, conforme o ofício nº 49/SSCCE/8964 (SIGAD 346077).

- **24.020 – Modernizar Infraestrutura do STVD SAGITARIO do APP-RF**

 - LOG10061 – Modernizar Infraestrutura STVD APP (Diagonal de Modernização)
 - Status: Cancelado
 - Localidades: Recife
 - Data prevista para conclusão: 12/11/2027
 - Justificativa para interrupção/cancelamento: RAJU 047/2024 assinada em 13/JUN/2024, mas a contratação do STVD5 foi postergada para JUNHO/2025, em função da necessidade de realizar novas cotações para os valores de Hardware que serão empregados no STVD4, APP Nordeste e no próprio STVD5.

- **24.026 – Modernizar Infraestrutura do STVD SAGITARIO do APP-NT**


 - LOG10061 – Modernizar Infraestrutura STVD APP (Diagonal de Modernização)
 - Status: Cancelado
 - Localidades: Natal
 - Data prevista para conclusão: 12/11/2027
 - Justificativa para interrupção/cancelamento: RAJU 047/2024 assinada em 13/JUN/2024, mas a contratação do STVD5 foi postergada para JUNHO/2025, em função da necessidade de realizar novas cotações para os valores de Hardware que serão empregados no STVD4, APP Nordeste e no próprio STVD5.

- **24.027 – Implantar Novas Instalações para o DTCEA/TWR/APP (Incluir Sistema Integrado de TWR)**

 - ATM07179 – Implantar Novas Instalações para o DTCEA/TWR/APP
 - Status: Cancelado
 - Localidades: Anápolis
 - Data prevista para conclusão: 27/11/2029
 - Justificativa para interrupção/cancelamento: Reformulação do cronograma físico.

- **24.039 – Substituir Radar de Terminal Primário e Secundário**

 - VIG05018 – Substituir Radar de Terminal Primário e Secundário
 - Status: Cancelado

	RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - 2025 TERMO DE PARCERIA Nº 002/CISCEA/2023	RT085/26
---	--	----------

- Localidades: Belém; Porto Velho; Navegantes; Curitiba; Manaus; Porto Seguro; Ribeirão Preto; Porto Alegre; Salvador; Campinas; Guarulhos; Campo Grande; Confins; Foz do Iguaçu; Santa Maria; Galeão; Florianópolis; Fortaleza; Gama; Congonhas; Cuiabá; Santa Cruz; Brasília; São José dos Campos; Recife; Natal; Anápolis
- Data prevista para conclusão: 19/12/2042
- Justificativa para interrupção/cancelamento: Projeto Interrompido a pedido do Parceiro Público.


→ Os projetos que seguem foram interrompidos ou cancelados no período de maio a agosto de 2025.

- **23.027 – Modernizar Central de Áudio (SITI)**

- TEL11018 – Modernizar Central de Áudio (SITI)
- Status: Cancelado
- Localidades: Campo Grande; Foz do Iguaçu; Maceió; Rio Branco; Manaus; Pirassununga; São José dos Campos; Recife; Canoas; Rio de Janeiro; Porto Alegre; Santa Cruz; Eduardo Gomes; Afonsos; Curitiba; São Paulo; Fortaleza; Natal; Porto Velho; Confins; Brasília; Santa Maria; Belém; Boa Vista; Florianópolis; Guaratinguetá; Galeão; Porto Seguro; São Luís; Cuiabá; Anápolis; Marte
- Data prevista para conclusão: 13/07/2025
- Justificativas para interrupção/cancelamento: Apesar de o Anexo B (gerado pelo SIGA) indicar que o projeto foi interrompido, este projeto na verdade foi cancelado, conforme despachos no Ofício nº 19/DT (SIGAD 384465), de 21 de agosto de 2025. De acordo com o atual planejamento da CISCEA, está em andamento o processo para substituição de centrais de áudio em 5 (cinco) localidades sob CODFIN TEL11021, por meio de licitação, e somente após a adjudicação e homologação desse certame será definido o processo para realizar a modernização das demais centrais do SISCEAB.

- **24.034 (v2) – Substituição de 5 Centrais de Áudio do SISCEAB**

- TEL11010 – Modernizar as Centrais de Áudio a Fim de Atender a Implantação do ATN-BR
- Status: Cancelado
- Localidades: Manaus; Anápolis; São Gonçalo do Amarante; Cuiabá; Pirassununga
- Data prevista para conclusão: 24/08/2027
- Justificativa para interrupção/cancelamento: Conforme orientação da Seção de Planejamento Estratégico (VPE), houve a necessidade de alteração do CODFIN associado ao projeto, deixando de ser o TEL11010 e passando a ser o TEL11021. Devido à impossibilidade técnica no SIGA de fazer essa alteração no projeto, a rede executiva existente recebeu a codificação “v2” e foi cancelada (apesar da indicação de “interrupção” no Anexo B, gerado pelo SIGA), tendo todas as suas informações migradas para uma nova rede executiva, associada ao CODFIN TEL11021, mantendo o código de execução 24.034. Atualmente, o projeto 24.034 encontra-se em execução, mantendo a previsão de conclusão em 24/08/2027.

	RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - 2025 TERMO DE PARCERIA Nº 002/CISCEA/2023	RT085/26
---	--	----------

- **25.022 – Implantar Novas Instalações para o DTCEA/TWR/APP Anápolis**

- ATM07232 – Implantar Novas Instalações para o DTCEA/TWR/APP Anápolis
- Status: Interrompido
- Localidades: Anápolis
- Data prevista para conclusão: 30/11/2029
- Justificativa para interrupção/cancelamento: Realizada reunião nas dependências da CISCEA, com participação da CISCEA (Presidente e Chefes de Divisão), DECEA (Subdepartamento Operacional e Subdepartamento Técnico) e corpo técnico da CTCEA, onde foram discutidas algumas premissas para a emissão de novas NOP e RTLI do empreendimento, que nortearão os trabalhos nas Divisões Operacional, Técnica e de Infraestrutura, para viabilizar o novo projeto para o Concentrador de APP Centro Oeste. O projeto foi interrompido até que seja definido novo escopo.

→ Os projetos que seguem foram interrompidos ou cancelados no período de setembro a dezembro de 2025.

- **23.029 – Substituir 2 (dois) PAR (Precision Approach Radar) Transportáveis (PFF030)**

- VIG05015 – Substituir 2 (dois) PAR (Precision Approach Radar) Transportáveis
- Status: Interrompido
- Localidades: Porto Velho, Natal
- Data prevista para conclusão: 13/07/2025
- Justificativas para interrupção/cancelamento: Conforme justificado e aprovado pelo SIGAD de nº 394184, este projeto foi temporariamente interrompido pela Presidência da CISCEA, o qual será mantido sob acompanhamento para eventual retorno quando alinhado.

- **24.046 (antigo) – Ampliar a ATN-BR no CINDACTA IV e em seus Sítios de Interesse Operacional**

- TEL08031 – Implantar Sistema de Comunicações por Meio de Comunicações por Meio Satelital na Área dos CINDACTA I e IV
- Status: Cancelado
- Localidades: Diversas
- Data prevista para conclusão: 12/01/2031
- Justificativa para interrupção/cancelamento: Conforme orientação da Seção de Planejamento Estratégico (VPE), houve a necessidade de alteração do CODFIN associado ao projeto, deixando de ser o TEL08031 e passando a ser o TEL02016. Devido à impossibilidade técnica no SIGA de fazer essa alteração no projeto, a rede executiva existente recebeu a codificação “antigo” e foi cancelada (apesar da indicação de “interrupção” no Anexo B, gerado pelo SIGA), tendo todas as suas informações migradas para uma nova rede executiva, associada ao CODFIN TEL02016, mantendo o código de execução 24.046. Atualmente, o projeto 24.046 encontra-se em execução, com nova previsão de conclusão em 30/06/2032.

- **24.051 (antigo) – Implantação do Sistema TATIC AFIS**

- ATM99056 – Implantar TATIC TWR (Módulo APP)

- Status: Cancelado
- Localidades: Diversas
- Data prevista para conclusão: 11/11/2026
- Justificativa para interrupção/cancelamento: Conforme orientação da Seção de Planejamento Estratégico (VPE), houve a necessidade de alteração do CODFIN associado ao projeto, deixando de ser o ATM99056 e passando a ser o ATM99057. Devido à impossibilidade técnica no SIGA de fazer essa alteração no projeto, a rede executiva existente recebeu a codificação “antigo” e foi cancelada (apesar da indicação de “interrupção” no Anexo B, gerado pelo SIGA), tendo todas as suas informações migradas para uma nova rede executiva, associada ao CODFIN ATM99057, mantendo o código de execução 24.051. Atualmente, o projeto 24.051 encontra-se em execução, com nova previsão de conclusão em 08/12/2027.

5.1.3 CICLO DE VIDA DOS PROJETOS

É importante ressaltar que o gerenciamento de projetos percorre fases delimitadas ao longo de sua execução. Na fase “Iniciação”, o projeto apresenta até 20% de seu avanço físico alcançado. Na fase “Desenvolvimento”, o projeto apresenta avanço físico alcançado acima de 20%, até 80% e na fase “Encerramento”, apresenta avanço físico acima de 80%. Assim, a conclusão de uma fase torna-se início de outra.

O gráfico 2 apresenta, a título de informações complementares, a quantidade de projetos cujos avanços físicos se enquadraram nas fases Iniciação, Desenvolvimento e Encerramento, para a carteira de projetos ao longo do ano de 2025. Nota-se que a carteira de projetos do ano de 2025 apresentou uma quantidade significativa de projetos na fase de desenvolvimento, cujas atividades referem-se ao gerenciamento de processos de contratação, fabricação, fornecimento e instalação de equipamentos e materiais.

CICLO DE VIDA DE PROJETOS

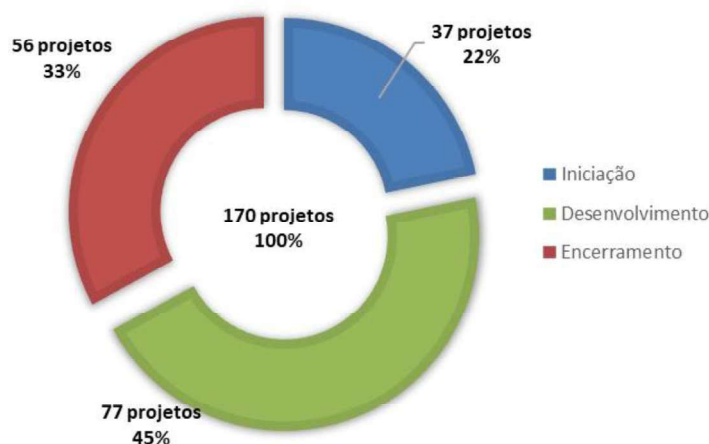


Gráfico 2 – Ciclo de vida dos projetos

6 DESEMPENHO QUANTITATIVO EFETIVO

Com base nos relatórios extraídos do SIGA para cada quadrimestre de 2025, apresenta-se no gráfico 3 uma síntese dos resultados alcançados.

DESEMPENHO QUANTITATIVO EFETIVO (IQPE %)

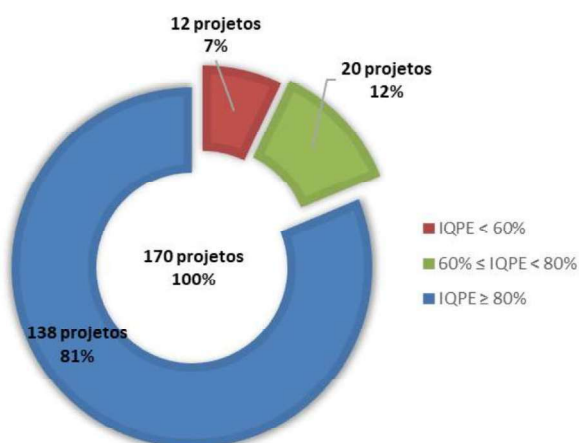


Gráfico 3 – Desempenho Quantitativo Efetivo (IQPE %)

Observa-se que, dentre os 170 (cento e setenta) projetos cuja execução ocorreu durante o ano de 2025:

- 138 (cento e trinta e oito) projetos (81%) apresentaram IQPE ≥ 80 (desempenho satisfatório);
- 20 (vinte) projetos (12%) apresentaram IQPE ≥ 60% e < 80% (desempenho parcialmente satisfatório); e
- 12 (doze) projetos (7%) apresentaram IQPE < 60% (desempenho não satisfatório).

Os resultados alcançados em cada quadrimestre do ano de 2025 podem ser observados no gráfico 4 abaixo.

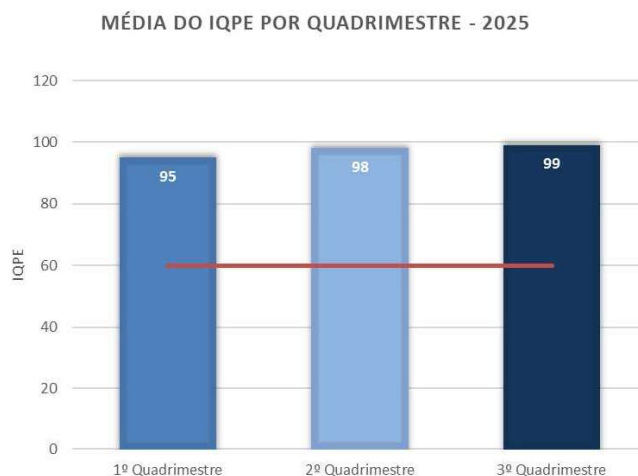


Gráfico 4 – Média do IQPE por Quadrimestre

Observa-se ainda que, segundo os relatórios de cada quadrimestre, a **Média dos Indicadores Quantitativos de Produtividade Efetiva (MQPE %)** para os 3 quadrimestres do ano de 2025 alcançou aproximadamente **97%** (noventa e sete por cento), indicando a alta eficiência na execução do Programa de Trabalho.

Quanto à MQPE para os projetos de cada Divisão/Seção, podemos observar no gráfico 5 que apenas o Centro de Tecnologia da Informação (VTI) ficou qualificado com desempenho insatisfatório, estando as demais Divisões/Seções qualificadas com desempenho satisfatório.

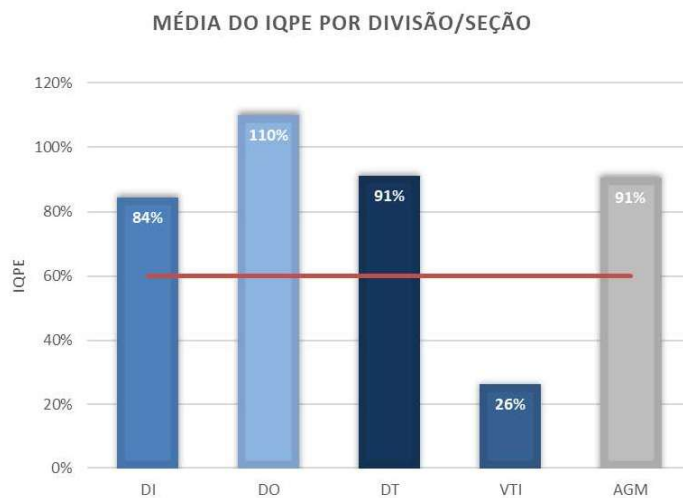


Gráfico 5 – Média do IQPE por Divisão/Seção

7 CONCLUSÃO

Pelo exposto, observa-se que no decorrer de 2025, a Parceria contribuiu com a realização de estudos e pesquisas, viabilizando a implementação de novas tecnologias no campo da navegação aérea.

Quantitativamente, esta contribuição materializou-se no gerenciamento de 170 (cento e setenta) projetos, dentre os quais destacam-se 26 (vinte e seis) concluídos no período.

ANEXO A - PROJETOS DO PROGRAMA DE TRABALHO
 JANEIRO A DEZEMBRO/2025
 TP002/CISCEA/2023

ITEM	INDICADOR	FUNCIONALIDADE / CODFIN	CÓDIGO INTERNO (IM)	DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA ESTIMADA DE TÉRMINO	2025				
						1ºQ	2ºQ	3ºQ		
1	EE	Em execução	LOG	LOG04405	11.045	SUBSTITUIR SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO NO DTCEA BELÉM LOCALIDADES: BELÉM	09/06/2027	•	•	•
2	EE	Em execução	LOG	LOG04409	11.047	SUBSTITUIR SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO - CINDACTA III LOCALIDADES: RECIFE	04/04/2030	•	•	•
3	EE	Em execução	ATM	ATM07173	13.047	GERENCIAR A IMPLANTAÇÃO DA NOVA TWR-RF E A AGLUTINAÇÃO DO APP NORDESTE LOCALIDADES: RECIFE	29/07/2029	•	•	•
4	CC	Concluído	OPM	OPM07003	14.039	GERENCIAR A IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO 5º/1º GCC EM PORTO VELHO LOCALIDADES: PORTO VELHO	21/03/2025	•		
5	CC	Concluído	NAV	NAV03016	17.014	IMPLANTAR 33 ESTAÇÕES DME LOCALIDADES: PORTO DE GALINHAS; VITÓRIA DE SAO ANTÃO; ILHÉUS; PONTA GROSSA; CARUARU; IGARASSÚ; JARAGUÁ; TAQUIARA; JEQUIÉ; MARAGOGIPE; BIGUAÇU; DIAMANTINA; CAMPO LARGO; TAQUARI; LAPA-SP; ALAGOINHAS; TEÓFILO OTONI; CURVELO; CALDAS NOVAS; REGISTRO; ITAJAI; ALTO PARAÍSO DE GOIÁS; INGLESES; MORRO DE SÃO PAULO; COLOMBO; PARÁ DE MINAS; JUAZEIRO DO NORTE; PAULO AFONSO; GURUPI; LAJES; PARANAGUÁ; JOÃO PESSOA; SETE LAGOAS	14/09/2025	•	•	•
6	EE	Em execução	MET	MET99011	17.036	PROVER SUPORTE AO STSC (ASSINATURA DEA) LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	20/11/2028	•	•	•
7	EE	Em execução	VIG	VIG02016	17.049	IMPLANTAR COBERTURA ADS-B EM TODO O ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO (PFF011) LOCALIDADES: GERAL	04/09/2026	•	•	•
8	EE	Em execução	ATM	ATM99047	17.061	IMPLANTAR O "LONG TERM MANPOWER PLANNING SYSTEM" (LTMPs) - TOTAL ATM LOCALIDADES: DIVERSAS	15/12/2026	•	•	•
9	EE	Em execução	LOG	LOG10005	18.003	ATUALIZAR HARDWARE DO STVD SAGITARIO DO ACC-AZ LOCALIDADES: MANAUS	25/06/2026	•	•	•
10	EE	Em execução	LOG	LOG04094	18.010	REVITALIZAR O SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAME- RJ LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	19/03/2026	•	•	•
11	CC	Concluído	NAV	NAV03005	18.024	IMPLANTAR DVOR/DME EM TABATINGA (PFF012) LOCALIDADES: TABATINGA	28/12/2024	•		
12	EE	Em execução	LOG	LOG04056	18.052	IMPLANTAR A GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO ÂMBITO DO DECEA LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	25/01/2030	•	•	•
13	CC	Concluído	NAV	NAV04014	19.009	SUBSTITUIR ILS CAT I - BRASÍLIA (PFF012) LOCALIDADES: BRASÍLIA	04/10/2025	•	•	•
14	CC	Concluído	NAV	NAV03023	19.014	IMPLANTAR DVOR/DME EM CAMPINAS LOCALIDADES: CAMPINAS	10/01/2025	•		
15	CC	Concluído	TEL	TEL99037	19.020	IMPLANTAR SIGSTEC 2 (PFF009) LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	16/07/2025	•	•	
16	CC	Concluído	NAV	NAV03016	19.028	IMPLANTAR 16 ESTAÇÕES DME LOCALIDADES: GUJARÁ-MIRIM; LÁBREA; SURUCUCU; ALTAMIRA; CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA; TARAUACÁ; BARCELOS; PORTO ESPERIDIÃO; JI-PARANÁ; CANARANA; ARIQUANÁ; PORTO ALEGRE DO NORTE; SORRISO; TANGARA DA SERRA; EIRUNEPE; CARAUARI	26/09/2025	•	•	•
17	CC	Concluído	LOG	LOG04293	19.030	AMPLIAR A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DOS TANQUES DE ÓLEO DIESEL DOS GRUPOS GERADORES DA CASA DE FORÇA DO ICEA (SEDE) LOCALIDADES: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/04/2025	•		
18	EE	Em execução	LOG	LOG04348	19.031	IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP- RJ LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	21/01/2027	•	•	•
19	EE	Em execução	AIS	AIS03004	19.034	MODERNIZAR OS SISTEMAS AIM-BR (PFF017) LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	01/10/2026	•	•	•
20	EE	Em execução	TEL	TEL11006	19.038	MODERNIZAR CENTRAIS DE AUDIO DOS APP DO PROJETO TRACON (PFF028) LOCALIDADES: CONFINS; SÃO PAULO; RIO DE JANEIRO	29/07/2026	•	•	•
21	EE	Em execução	LOG	LOG10016	19.039	ATUALIZAR HARDWARE DO STVD SAGITARIO DO ACC-CW LOCALIDADES: CURITIBA	18/12/2026	•	•	•
22	EE	Em execução	LOG	LOG10002	19.040	ATUALIZAR HARDWARE DO STVD SAGITARIO DO ACC-RE LOCALIDADES: RECIFE	09/01/2026	•	•	•
23	CC	Concluído	MET	MET05010	19.051	IMPLANTAR RADAR METEOROLÓGICO EM RIO BRANCO LOCALIDADES: RIO BRANCO	03/10/2025	•	•	•
24	EE	Em execução	MET	MET05010	19.052	IMPLANTAR RADAR METEOROLÓGICO EM VILHENA LOCALIDADES: VILHENA	21/01/2026	•	•	•
25	EE	Em execução	MET	MET05010	19.053	IMPLANTAR RADAR METEOROLÓGICO NA CHAPADA DOS GUIMARAES LOCALIDADES: CHAPADA DOS GUIMARAES	15/01/2027	•	•	•
26	EE	Em execução	MET	MET05010	19.054	IMPLANTAR RADAR METEOROLÓGICO EM CACHIMBO LOCALIDADES: CACHIMBO	09/04/2027	•	•	•
27	EE	Em execução	LOG	LOG10046	19.065	ATUALIZAR HARDWARE DO STVD DA/COM DA DIVOC LOCALIDADES: BRASÍLIA	19/05/2026	•	•	•
28	EE	Em execução	LOG	LOG07021	19.066	ADQUIRIR LICENÇAS SASS-C (EUROCONTROL) - PFF004 LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	05/04/2028	•	•	•
29	EE	Em execução	OPM	OPM99007	19.069	MODERNIZAR SISTEMA DACOM LOCALIDADES: RECIFE; CURITIBA; SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; MANAUS; BRASÍLIA; RIO DE JANEIRO	28/03/2028	•	•	•
30	EE	Em execução	LOG	LOG04033	20.001	SUBSTITUIR OS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO - BOA VISTA LOCALIDADES: BOA VISTA	03/03/2027	•	•	•
31	EE	Em execução	LOG	LOG04407	20.002	SUBSTITUIR SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO. - DTCEA OIAPOQUE LOCALIDADES: OIAPOQUE	09/07/2027	•	•	•

ANEXO A - PROJETOS DO PROGRAMA DE TRABALHO
JANEIRO A DEZEMBRO/2025
TP002/CISCEA/2023

ITEM	INDICADOR	FUNCIONALIDADE / CODFIN	CÓDIGO INTERNO (IM)	DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA ESTIMADA DE TÉRMINO	2025				
						1ºQ	2ºQ	3ºQ		
32	EE	Em execução	LOG	LOG04408	20.003	SUBSTITUIR OS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO DO DTCEA-UA (SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA) LOCALIDADES: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	07/05/2027	•	•	•
33	EE	Em execução	LOG	LOG04406	20.004	SUBSTITUIR OS SISTEMAS DE ENERGIA, ATERRAMENTO E CLIMATIZAÇÃO DO DTCEA TABATINGA LOCALIDADES: TABATINGA	09/04/2027	•	•	•
34	CC	Concluído	MET	MET05010	20.010	SUBSTITUIR RADAR METEOROLÓGICO EM BELÉM LOCALIDADES: BELÉM	18/12/2025	•	•	•
35	CC	Concluído	NAV	NAV03019	20.011	IMPLANTAR DVOR/DME EM BACACHERI-PR (PFF012) LOCALIDADES: BACACHERI	20/12/2025	•	•	•
36	CC	Concluído	NAV	NAV04021	20.017	SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO - ANÁPOLIS LOCALIDADES: ANÁPOLIS	25/07/2025	•	•	•
37	CC	Concluído	NAV	NAV99004	20.018	SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO DE CANOAS LOCALIDADES: CANOAS	26/09/2025	•	•	•
38	CC	Concluído	NAV	NAV99008	20.019	SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO DE SANTA MARIA LOCALIDADES: SANTA MARIA	22/08/2025	•	•	•
39	CC	Concluído	MET	MET07048	20.027	IMPLANTAR EMS-A EM 8 AEROPORTOS REGIONAIS (SAC) LOCALIDADES: DIVERSAS	06/11/2025	•	•	•
40	EE	Em execução	RHU	RHU05199	20.028	IMPLANTAR PNR NO RECIFE LOCALIDADES: RECIFE	09/09/2027	•	•	•
41	EE	Em execução	TEL	TEL03039	20.029	IMPLANTAR FREQUÊNCIAS VHF E CONSOLES OPERACIONAIS PARA O SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE VOO (FIS) NOS REGIONAIS LOCALIDADES: DIVERSAS	27/02/2026	•	•	•
42	EE	Em execução	TEL	TEL07004	20.030	MODERNIZAR ESTAÇÕES REMOTAS DE DATALINK (DLRS) - FASE 3 (PFF030) LOCALIDADES: GERAL	08/01/2027	•	•	•
43	CC	Concluído	TEL	TEL02012	20.031	IMPLANTAR ATN-BR (VSAT) NA REGIÃO DO CRCEA-SE LOCALIDADES: DIVERSAS	05/10/2025	•	•	•
44	EE	Em execução	ATM	ATM11005	20.033	IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE TWR EM SALVADOR, BRASÍLIA, PONTA PELADA, BACACHERI, RECIFE, SÃO PAULO (TREINAMENTO), ANÁPOLIS E CAMPO DE MARTE LOCALIDADES: CAMPO DE MARTE; ANÁPOLIS; BACACHERI; SALVADOR; RECIFE; PONTA PELADA; BRASÍLIA; SÃO PAULO	03/12/2027	•	•	•
45	EE	Em execução	SAR	SAR03014	20.037	IMPLANTAR SISTEMA DE DETECÇÃO PRIMÁRIO OTHR (PFF030) LOCALIDADES: GAMA	23/06/2029	•	•	•
46	EE	Em execução	LOG	LOG04101	20.040	SUBSTITUIR SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO - CINDACTA IV LOCALIDADES: MANAUS	31/12/2027	•	•	•
47	EE	Em execução	TEL	TEL11016	21.001	MODERNIZAR CENTRAL DE ÁUDIO E GRAVADORES DO APP- ME LOCALIDADES: MACAÉ	03/01/2026	•	•	•
48	CC	Concluído	MET	MET99012	21.004	IMPLANTAR CENTRO INTEGRADO DE METEOROLOGIA AERONÁUTICA - CIMAER - INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	08/04/2025	•	•	•
49	EE	Em execução	LOG	LOG10056	21.014	INSTALAR NOVAS VERSÕES DO SAGITARIO LOCALIDADES: DIVERSAS	07/10/2027	•	•	•
50	EE	Em execução	LOG	LOG04183	21.019	SUBSTITUIR SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO - CUIABÁ LOCALIDADES: CUIABÁ	25/02/2028	•	•	•
51	EE	Em execução	LOG	LOG04187	21.020	SUBSTITUIR SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO DO DTCEA- MACEIÓ LOCALIDADES: MACEIÓ	06/07/2028	•	•	•
52	EE	Em execução	TEL	TEL02014	21.029	IMPLANTAR A ATN-BR (MPLS) NA REGIÃO DO CRCEA-SE LOCALIDADES: DIVERSAS	27/06/2026	•	•	•
53	EE	Em execução	LOG	LOG10010	21.030	MANter INFRAESTRUTURA DO AMHS LOCALIDADES: BRASÍLIA	11/10/2027	•	•	•
54	CC	Concluído	TEL	TEL03033	21.031	IMPLANTAR REDE DE DUTOS EM NAVEGANTES (PFF010) LOCALIDADES: NAVEGANTES	12/12/2025	•	•	•
55	CC	Concluído	LOG	LOG10004	21.036	ATUALIZAR HARDWARE DO STVD SAGITARIO DO ACC-AO LOCALIDADES: RECIFE	12/09/2025	•	•	•
56	EE	Em execução	LOG	LOG10020	21.037	ATUALIZAR HARDWARE DO STVD SAGITARIO DO APP-SP LOCALIDADES: SÃO PAULO	28/03/2027	•	•	•
57	EE	Em execução	LOG	LOG10009	21.038	ATUALIZAR HARDWARE DO STVD SAGITARIO DO APP-BH LOCALIDADES: BELO HORIZONTE	07/01/2027	•	•	•
58	EE	Em execução	OPM	OPM12001	22.001	IMPLANTAR RADARES TRIDIMENSIONAIS MÓVEIS 1º GCC LOCALIDADES: CANOAS; SANTA MARIA	24/03/2029	•	•	•
59	EE	Em execução	LOG	LOG10018	22.006	ATUALIZAR HARDWARE DO STVD SAGITARIO DO APP-CT LOCALIDADES: CURITIBA	02/05/2028	•	•	•
60	EE	Em execução	ATM	ATM99032	22.007	DESENVOLVER EVOLUÇÃO DO SISTEMA TATIC FLOW LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	18/08/2028	•	•	•
61	EE	Em execução	ATM	ATM99068	22.009	DESENVOLVER PLATAFORMA ÚNICA PARA OS SISTEMAS DACOM E SAGITARIO DO SISCEAB SIDAECTA LOCALIDADES: DIVERSAS	30/11/2026	•	•	•
62	EE	Em execução	VIG	VIG02020	22.011	IMPLEMENTAR O CONCEITO PBCS LOCALIDADES: RECIFE	22/10/2027	•	•	•
63	CC	Concluído	NAV	NAV04031	22.012	SUBSTITUIR LOC DO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE (PFF012) LOCALIDADES: PORTO ALEGRE	05/05/2025	•	•	•
64	EE	Em execução	NAV	NAV04023	22.013	RELOCAR GLIDE SLOPE E INSTALAR ANTENA CAPTURE- EFFECT EM FOZ DO IGUAÇU (PFF012) LOCALIDADES: FOZ DO IGUAÇU	18/07/2026	•	•	•
65	EE	Em execução	LOG	LOG10030	22.014	ATUALIZAR HARDWARE DO STVD SAGITARIO DO SIMULADOR DO ICEA LOCALIDADES: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	16/03/2029	•	•	•
66	EE	Em execução	MET	MET02015	22.016	DESENVOLVER SISTEMA DE METEOROLOGIA (SISMET) LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	29/06/2027	•	•	•

ANEXO A - PROJETOS DO PROGRAMA DE TRABALHO
 JANEIRO A DEZEMBRO/2025
 TP002/CISCEA/2023

ITEM	INDICADOR	FUNCIONALIDADE / CODFIN	CÓDIGO INTERNO (IM)	DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA ESTIMADA DE TÉRMINO	2025			
						1ºQ	2ºQ	3ºQ	
67	EE	Em execução	LOG LOG10031	22.017	ATUALIZAR HARDWARE DO STVD SAGITARIO DO SIMULADOR DA EEAR LOCALIDADES: GUARATINGUETÁ	16/03/2029			•
68	EE	Em execução	ATM ATM08017	22.021	IMPLANTAR O SAGITARIO NO APP NORDESTE LOCALIDADES: RECIFE	08/01/2028	•	•	•
69	EE	Em execução	TEL TEL02015	22.024	IMPLANTAR ATN-BR NA REGIÃO DO APP NORDESTE LOCALIDADES: RECIFE	15/07/2026	•	•	•
70	EE	Em execução	TEL TEL11014	22.025	INSTALAR SISTEMA DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ÁUDIO NO APP NORDESTE LOCALIDADES: RECIFE	21/01/2026	•	•	•
71	EE	Em execução	TEL TEL11015	22.026	INSTALAR CENTRAL DE ÁUDIO NO APP NORDESTE LOCALIDADES: RECIFE	11/04/2027	•	•	•
72	EE	Em execução	LOG LOG10058	22.028	MODERNIZAÇÃO DO SIMULADOR DE CONTROLE DE AERODROMO (SICAD) LOCALIDADES: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	26/10/2026	•	•	•
73	EE	Em execução	ATM ATM99055	22.029	ATUALIZAR SAGITARIO FASE 4 (PBCS) LOCALIDADES: DIVERSAS	16/11/2027	•	•	•
74	EE	Em execução	LOG LOG04191	23.002	SUBSTITUIR SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO - MACAPÁ LOCALIDADES: MACAPÁ	20/03/2031	•	•	•
75	EE	Em execução	LOG LOG04191	23.004	SUBSTITUIR SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO (DIAGONAL DE SUBSTITUIÇÃO) - PV LOCALIDADES: PORTO VELHO	06/04/2029	•	•	•
76	EE	Em execução	LOG LOG04074	23.006	SUBSTITUIR SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO - BARRA DO GARÇAS LOCALIDADES: BARRA DO GARÇAS	27/01/2029	•	•	•
77	CC	Concluído	ATM ATM99056	23.007	IMPLANTAR TATIC TWR (+ MÓDULO APP) LOCALIDADES: PRESIDENTE PRUDENTE; JACAREPAGUÁ; TERESINA; UBERLÂNDIA; SANTARÉM; MACAPÁ; UBERABA; LONDRINA; PALMAS; RIBEIRÃO PRETO	05/05/2025	•	•	•
78	EE	Em execução	LOG LOG10006	23.008	ATUALIZAR HARDWARE DO STVD SAGITARIO DO ACC-BS LOCALIDADES: BRASÍLIA	26/03/2026	•	•	•
79	EE	Em execução	LOG LOG10007	23.009	ATUALIZAR HARDWARE DO STVD SAGITARIO DO APP-ME LOCALIDADES: MACAÉ	25/04/2028	•	•	•
80	EE	Em execução	ATM ATM99046	23.010	DESENVOLVER E IMPLANTAR SISTEMA SIGMA - FASE 6 (INCLUINDO HARDWARE) LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	12/01/2029	•	•	•
81	EE	Em execução	VIG VIG02022	23.011	IMPLANTAR ADS-B NA BACIA DE SANTOS (PFF008) LOCALIDADES: SANTOS	12/04/2027	•	•	•
82	EE	Em execução	MET MET04001	23.012	MODERNIZAR O BANCO OPMET LOCALIDADES: BRASÍLIA	24/03/2028	•	•	•
83	EE	Em execução	MET MET02012	23.014	PROVER ASSINATURA DO SISTEMA DE COLETA DE DADOS AMDAR - PROGRAMA SIRIUS LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	24/05/2029	•	•	•
84	EE	Em execução	ATM ATM99011	23.018	MODERNIZAR PLATAO FASE 3 LOCALIDADES: SÃO PAULO; BELO HORIZONTE; BRASÍLIA; CURITIBA; GUARATINGUETÁ; SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; RIO DE JANEIRO; RECIFE; MANAUS	30/07/2030	•	•	•
85	EE	Em execução	TEL TEL04011	23.019	AMPLIAR A COBERTURA DE UHF TERRA-AR EM AMBITO NACIONAL LOCALIDADES: BARREIRAS; JUNDIÁ; GURUPI; VARGINHA; CANARANA; PORTO ESPERIDIÃO; JATAÍ; TARAUAÇÁ; SÃO FÉLIX DO XINGU; BARRA DO GARÇAS; JI-PARANÁ; BELÉM; MANICORÉ; JACAREACANGA; SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA; CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA; SANTARÉM; MARABÁ; ALTAMIRA; SINOP; ANÁPOLIS	10/05/2027	•	•	•
86	EE	Em execução	TEL TEL09052	23.020	REVITALIZAÇÃO DAS REDES ELETRÔNICAS DO CINDACTA IV, DTCEA-EG, DTCEA-MN E SIAT LOCALIDADES: MANAUS	14/10/2027	•	•	•
87	EE	Em execução	MET MET06031	23.021	SUBSTITUIR ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE ALTITUDE (EMA) CONVENCIONAL POR AUTOMÁTICA (EMA-A) LOCALIDADES: CRUZEIRO DO SUL; MACAPÁ; SANTARÉM	10/04/2028	•	•	•
88	CC	Concluído	LOG LOG99046	23.025	IMPLEMENTAR SISTEMA CRÍTICO DE ENERGIA DUALIZADO NA DIVOC EM APOIO AO SISCEAB (ALIMENTAÇÃO DA DIVOC PELA KF DO CINDACTA I) LOCALIDADES: BRASÍLIA	29/07/2025	•	•	•
89	EE	Em execução	TEL TEL02022	23.026	IMPLANTAR SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES NO CENTRO INTEGRADO DE METEOROLOGIA AERONÁUTICA - CIMAER LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	04/07/2026	•	•	•
90	IN	Interrompido	TEL TEL11018	23.027	MODERNIZAR CENTRAL DE ÁUDIO (SIT) LOCALIDADES: CAMPO GRANDE; FOZ DO IGUAÇU; MACEIÓ; RIO BRANCO; MANAUS; PIRASSUNUNGA; SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; RECIFE; CANOAS; RIO DE JANEIRO; PORTO ALEGRE; SANTA CRUZ; EDUARDO GOMES; AFONSOS; CURITIBA; SÃO PAULO; FORTALEZA; NATAL; PORTO VELHO; CONFINS; BRASÍLIA; SANTA MARIA; BELÉM; BOA VISTA; FLORIANÓPOLIS; GUARATINGUETÁ; GALEÃO; PORTO SEGURO; SÃO LUÍS; CUIABÁ; ANÁPOLIS; MARTE	13/07/2025	•	•	•
91	EE	Em execução	VIG VIG99003	23.028	SUBSTITUIR RADARES PAR FIXOS LOCALIDADES: SANTA CRUZ; CANOAS; ANÁPOLIS; SANTA MARIA	27/01/2028	•	•	•
92	IN	Interrompido	VIG VIG05015	23.029	SUBSTITUIR 2 (DOIS) PAR (PRECISION APPROACH RADAR) TRANSPORTÁVEIS (PFF030) LOCALIDADES: PORTO VELHO; NATAL	14/04/2027	•	•	•
93	EE	Em execução	VIG VIG02017	23.030	IMPLANTAR RADAR SECUNDÁRIO AUTÔNOMO NA TMA PORTO ALEGRE LOCALIDADES: CAXIAS DO SUL	26/07/2027	•	•	•
94	EE	Em execução	VIG VIG03036	23.032	MODERNIZAR RADARES DE ROTA PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO ONZE LOCALIDADES LOCALIDADES: FORTALEZA; TABATINGA; BOA VISTA; SÃO GABRIEL DA CACHEIRA; NATAL; SALVADOR; GAMA; BELEM; MANAUS; MACEIÓ; CANGUÇU	03/01/2029	•	•	•

ANEXO A - PROJETOS DO PROGRAMA DE TRABALHO
 JANEIRO A DEZEMBRO/2025
 TP002/CISCEA/2023

ITEM	INDICADOR	FUNCIONALIDADE / CODFIN	CÓDIGO INTERNO (IM)	DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA ESTIMADA DE TÉRMINO	2025			
						1ºQ	2ºQ	3ºQ	
95	EE	Em execução	VIG VIG03037	23.033	IMPLANTAR RADAR DE ROTA PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO EM PRESIDENTE PRUDENTE LOCALIDADES: PRESIDENTE PRUDENTE	10/04/2026	•	•	•
96	EE	Em execução	LOG LOG10058	23.034	AMPLIAR O SISTEMA DE SIMULAÇÃO 360° DO SITC DO ICEA LOCALIDADES: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	11/04/2026	•	•	•
97	EE	Em execução	LOG LOG07118	23.039	MANTER LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDIMENTO A CISCEA LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	27/09/2026	•	•	
98	EE	Em execução	LOG LOG10013	23.040	ATUALIZAR HARDWARE DO STVD SAGITARIO DO APP-CG LOCALIDADES: CAMPO GRANDE	17/07/2028	•	•	•
99	EE	Em execução	LOG LOG10001	23.041	ATUALIZAR HARDWARE DO STVD SAGITARIO DO APP-BE LOCALIDADES: BELÉM	28/07/2028	•	•	•
100	EE	Em execução	LOG LOG10061	23.042	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA DO STVD SAGITARIO DO APP-MN LOCALIDADES: MANAUS	16/08/2028	•	•	•
101	EE	Em execução	LOG LOG10061	23.043	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA DO STVD SAGITARIO DO APP-YS LOCALIDADES: PIRASSUNUNGA	18/11/2028	•	•	•
102	EE	Em execução	NAV NAV03024	23.045	ATUALIZAR DIAGONAL DE SUBSTITUIÇÃO DOS DVOR/DME LOCALIDADES: BOA VISTA; GALEÃO; CONGONHAS; ITABORAÍ; FERNANDO DE NORONHA; RECIFE; FOZ DO IGUAÇU; DIVERSAS; SÃO PEDRO DA ALDEIA; ANÁPOLIS; CONFINS; BARRA DO PIRAI	28/09/2030	•	•	•
103	EE	Em execução	VIG VIG04010	24.001	IMPLANTAR RADARES PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS DE ROTA EM LOCAIS DE INTERESSE DO SISCEAB LOCALIDADES: DIVERSAS	16/08/2031	•	•	•
104	EE	Em execução	MET MET07043	24.002	SUBSTITUIR AS ATUAIS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS POR EMS-1, EMS-2 E EMS-3 LOCALIDADES: MACEIÓ; VILHENA; URUGUAIANA; BOA VISTA; SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA; PORTO VELHO; TABATINGA; CANOAS; SÃO LUÍS; ANÁPOLIS; SÃO PAULO; SALVADOR; BACACHERI; SÃO PEDRO DA ALDEIA; MANAUS	24/10/2031	•	•	•
105	EE	Em execução	MET MET07047	24.003	MODERNIZAR AS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DE SUPERFÍCIE (DIAGONAL DE MODERNIZAÇÃO) LOCALIDADES: DIVERSAS; TIRIÓS; BARBACENA; PORTO SEGURO; VILHENA; PIRASSUNUNGA; GUARATINGUETÁ; SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2027	•	•	•
106	EE	Em execução	ATM ATM99055	24.006	ADQUIRIR LICENÇA E SUPORTE DO AMAN LOCALIDADES: SÃO PAULO; RIO DE JANEIRO, CURITIBA; BRASÍLIA; BELO HORIZONTE	26/07/2031	•	•	•
107	EE	Em execução	LOG LOG10062	24.007	IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TATIC TWR LOCALIDADES: GUARATINGUETÁ, MARTE, SÃO PEDRO DA ALDEIA; ANÁPOLIS	06/08/2026	•	•	•
108	EE	Em execução	LOG LOG10063	24.008	MODERNIZAR SISTEMAS INTEGRADOS DE TORRE DE CONTROLE (SITC) LOCALIDADES: BOA VISTA; PORTO SEGURO; PORTO ALEGRE; PORTO VELHO; CANOAS; MACEIÓ; SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; SÃO LUÍS; NATAL; SANTA MARIA, RIO BRANCO; TAUBATÉ	08/02/2029	•	•	•
109	EE	Em execução	OPM OPM09001	24.009	ADQUIRIR TORRE DE CONTROLE TRANSPORTAVEL (TWR-T) LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	07/02/2027	•	•	•
110	EE	Em execução	LOG LOG10025	24.010	MODERNIZAR HARDWARE DO SISTEMA SIGMA DO CGNA LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	05/08/2026	•	•	•
111	EE	Em execução	ATM ATM99070	24.011	SUBSTITUIR O SOFTWARE ARCMAP PELO SOFTWARE ARCGIS PRO LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	20/12/2030	•	•	•
112	EE	Em execução	ATM ATM04025	24.012	COMPLEMENTAR INFRAESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO TECNOLÓGICA DA BASE DE DADOS UNIFICADA DO NOVO PROJETO GEA LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO; SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	16/05/2027	•	•	•
113	CC	Concluído	CAR CAR04033	24.013	IMPLANTAR O PROCESSO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CARTAS VFR E CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS SIG (PFF017) LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	05/05/2025	•	•	
114	EE	Em execução	TEL TEL03040	24.014	ATUALIZAR DIAGONAL DE MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE VHF LOCALIDADES: MACAPÁ; JACAREACANGA; TRÊS MARIAS; TABATINGA; FOZ DO IGUAÇU; SÃO LUIZ DO NORTE; GAVIÃO PEIXOTO; PORTO VELHO; PARINTINS; ITAITUBA; BARBACENA; SÃO LUÍS; PASSO FUNDO; MARABÁ; RIO BRANCO; LAGOA SANTA; SÃO PEDRO DA ALDEIA; GALEÃO; PALMAS; SÃO ROQUE; UBERABA; BACACHERI; GAMA; GUARATINGUETÁ; BELÉM; EIRUNEPÉ; MANICORÉ; PIEDADE; CRUZEIRO DO SUL; BRASÍLIA; ALTAMIRA; MANAUS; SANTIAGO; CARAUARI; RIBEIRÃO PRETO; DIVERSAS; IMPERATRIZ; JARAGUARI; MONTES CLAROS; SORRISO; PORTO ALEGRE DO NORTE; TANGARÁ DA SERRA; PORTO ESPERIDIÃO; SANTARÉM; PORTO TROMBETAS; CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA; PIRASSUNUNGA; SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA; SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; SÃO RAIMUNDO NONATO; PONTA PORÁ; CATANDUVAS; GURUPI; JUNDIÁ; PORTO ALEGRE; FORTALEZA; VILHENA; SÃO FRANCISCO DO SUL; JATAÍ; MORRO DA IGREJA; CUIABÁ; CANGUÇU; EDUARDO GOMES; SANTA TERESA; ALTO PARAÍSO DE GOIÁS; CANOAS; PICO DO COUTO; SURUCUCU; VARGINHA; LENÇÓIS; SÃO FÉLIX DO XINGU; TEÓFILO OTONI; TARAUCÁ; BOA VISTA; PATOS; CAMPINAS; TIRIÓS; IPAMERI; TANABI; CURITIBA	22/12/2031	•	•	•
115	EE	Em execução	LOG LOG10061	24.016	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA DO STVD SAGITARIO DO APP-BR LOCALIDADES: BRASÍLIA	01/10/2027	•	•	•
116	EE	Em execução	LOG LOG10061	24.017	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA DO STVD SAGITARIO DO APP-FL LOCALIDADES: FLORIANÓPOLIS	30/04/2027	•	•	•

ANEXO A - PROJETOS DO PROGRAMA DE TRABALHO
 JANEIRO A DEZEMBRO/2025
 TP002/CISCEA/2023

ITEM	INDICADOR	FUNCIONALIDADE / CODFIN	CÓDIGO INTERNO (IM)	DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA ESTIMADA DE TÉRMINO	2025			
						1ºQ	2ºQ	3ºQ	
117	IN	Interrompido	LOG LOG10061	24.018	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA DO STVD SAGITARIO DO APP-FZ LOCALIDADES: MANAUS; MACAÉ; NATAL; SALVADOR; RECIFE; ANÁPOLIS; SÃO PAULO; SANTA MARIA; VITÓRIA; PORTO ALEGRE; FORTALEZA; BELÉM; BELO HORIZONTE; PORTO VELHO; CURITIBA; CAMPO GRANDE; PORTO SEGURO; PIRASSUNUNGA; FLORIANÓPOLIS; CUIABÁ; RIO DE JANEIRO; BRASÍLIA; LONDRINA; MACEIÓ; FOZ DO IGUAÇU	10/11/2028	•		
118	IN	Interrompido	LOG LOG10061	24.019	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA DO STVD SAGITARIO DO APP-LO LOCALIDADES: SÃO PAULO; BELO HORIZONTE; PIRASSUNUNGA; ANÁPOLIS; FOZ DO IGUAÇU; BELÉM; VITÓRIA; FORTALEZA; PORTO VELHO; FLORIANÓPOLIS; MACAÉ; NATAL; RIO DE JANEIRO; CAMPO GRANDE; SANTA MARIA; SALVADOR; PORTO ALEGRE; CUIABÁ; MACEIÓ; RECIFE; PORTO SEGURO; LONDRINA; CURITIBA; MANAUS; BRASÍLIA	17/12/2027	•		
119	IN	Interrompido	LOG LOG10061	24.020	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA DO STVD SAGITARIO DO APP-RF LOCALIDADES: BELÉM; PIRASSUNUNGA; VITÓRIA; SALVADOR; SANTA MARIA; FLORIANÓPOLIS; FOZ DO IGUAÇU; BELO HORIZONTE; MACEIÓ; RIO DE JANEIRO; CUIABÁ; SÃO PAULO; PORTO VELHO; MACAÉ; CURITIBA; FORTALEZA; ANÁPOLIS; PORTO SEGURO; MANAUS; BRASÍLIA; NATAL; RECIFE; PORTO ALEGRE; LONDRINA; CAMPO GRANDE	12/11/2027	•		
120	EE	Em execução	LOG LOG10061	24.021	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA DO STVD SAGITARIO DO APP-SM LOCALIDADES: SANTA MARIA	02/07/2027	•	•	•
121	EE	Em execução	ATM ATM08006	24.022	IMPLANTAR O SAGITARIO NO STVD DO APP-FI LOCALIDADES: FOZ DO IGUAÇU	12/02/2029	•	•	•
122	EE	Em execução	ATM ATM08006	24.023	IMPLANTAR SAGITARIO NO STVD DO APP-PS LOCALIDADES: PORTO SEGURO	21/11/2028	•	•	•
123	EE	Em execução	LOG LOG10043	24.024	ATUALIZAR HARDWARE DO BANCO OPMET LOCALIDADES: BRASÍLIA	07/07/2028	•	•	•
124	EE	Em execução	LOG LOG10059	24.025	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA DO STVD SAGITARIO DO ACC-BS LOCALIDADES: BRASÍLIA	10/09/2027	•	•	•
125	IN	Interrompido	LOG LOG10061	24.026	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA DO STVD SAGITARIO DO APP-NT LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO; PIRASSUNUNGA; FOZ DO IGUAÇU; LONDRINA; FLORIANÓPOLIS; PORTO VELHO; MACEIÓ; MACAÉ; VITÓRIA; NATAL; BRASÍLIA; CAMPO GRANDE; SALVADOR; SANTA MARIA; MANAUS; CURITIBA; BELO HORIZONTE; PORTO SEGURO; SÃO PAULO; FORTALEZA; ANÁPOLIS; BELÉM; CUIABÁ; RECIFE; PORTO ALEGRE	12/11/2027	•		
126	IN	Interrompido	ATM ATM07179	24.027	IMPLANTAR NOVAS INSTALAÇÕES PARA O DTCEA/TWR/APP (INCLUIR SISTEMA INTEGRADO DE TWR) LOCALIDADES: ANÁPOLIS	27/11/2029	•		
127	EE	Em execução	OPM OPM99036	24.030	DESENVOLVER SIMULADOR INTEGRADO DE OPERAÇÕES AÉREAS MILITARES LOCALIDADES: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	15/07/2028	•	•	•
128	EE	Em execução	TEL TEL05005	24.031	IMPLEMENTAR UPGRADE DA CENTRAL DE ÁUDIO E SISTEMA HF PARA ATENDER NOVA ESPECIFICAÇÃO DA ICAO DE EXPANSÃO DO CÓDIGO SELCAL (SELCAL 32). LOCALIDADES: RECIFE	26/09/2027	•	•	•
129	EE	Em execução	TEL TEL11021	24.034	SUBSTITUIR 5 CENTRAIS DE ÁUDIO DO SISCEAB LOCALIDADES: CUIABÁ; PIRASSUNUNGA; DIVERSAS; ANÁPOLIS; SÃO GONÇALO DO AMARANTE; MANAUS	24/08/2027			•
130	IN	Interrompido	VIG VIG05018	24.039	SUBSTITUIR RADAR DE TERMINAL PRIMARIO E SECUNDARIO LOCALIDADES: BELÉM; PORTO VELHO; NAVEGANTES; CURITIBA; MANAUS; PORTO SEGURO; RIBEIRÃO PRETO; PORTO ALEGRE; SALVADOR; CAMPINAS; GUARULHOS; CAMPO GRANDE; CONFINS; FOZ DO IGUAÇU; SANTA MARIA; GALEÃO; FLORIANÓPOLIS; FORTALEZA; GAMA; CONGONHAS; CUIABÁ; SANTA CRUZ; BRASÍLIA; SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; RECIFE; NATAL; ANÁPOLIS	19/12/2042	•		
131	EE	Em execução	ATM ATM08020	24.041	IMPLANTAR EDIFÍCIO TÉCNICO OPERACIONAL (ETO) E KF PARA OS APP-PA, APP-CT E APP-FL NA BAFL LOCALIDADES: FLORIANÓPOLIS	19/01/2029	•	•	•
132	EE	Em execução	LOG LOG07030	24.042	SUBSTITUIR DESKTOPS E NOTEBOOKS DE USO DO DECEA E OM SUBORDINADAS LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	24/11/2025	•	•	
133	EE	Em execução	VIG VIG06002	24.043	SUBSTITUIR RADARES METEOROLÓGICOS LOCALIDADES: BELÉM; TEFÉ; PICO DO COUTO; MANAUS; CRUZEIRO DO SUL; SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA; SÃO LUÍS; GAMA; TABATINGA; MORRO DA IGREJA; BOA VISTA; PORTO VELHO; SANTIAGO; SÃO ROQUE; CANGUÇU; SANTAREM; MORRO DA IGREJA; MACAPÁ	17/11/2030	•	•	•
134	EE	Em execução	TEL TEL04012	24.045	MODERNIZAR ESTAÇÕES DE UHF LOCALIDADES: DIVERSAS	08/08/2032	•	•	•
135	EE	Em execução	TEL TEL02016	24.046	AMPLIAR A ATN-BR NO CINDACTA IV E EM SEUS SÍTIOS DE INTERESSE OPERACIONAL LOCALIDADES: MANAUS	30/06/2032		•	•
136	EE	Em execução	TEL TEL99048	24.047	IMPLANTAR SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO SATELITAL NO CINDACTA I LOCALIDADES: DIVERSAS	30/04/2030	•	•	•
137	EE	Em execução	LOG LOG04191	24.048	SUBSTITUIR SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO (DIAGONAL DE SUBSTITUIÇÃO) - SL LOCALIDADES: SÃO LUÍS	26/06/2031	•	•	•
138	EE	Em execução	LOG LOG04191	24.049	SUBSTITUIR SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO (DIAGONAL DE SUBSTITUIÇÃO) - IMPERATRIZ (MA) LOCALIDADES: IMPERATRIZ	27/04/2031	•	•	•

ANEXO A - PROJETOS DO PROGRAMA DE TRABALHO
 JANEIRO A DEZEMBRO/2025
 TP002/CISCEA/2023

ITEM	INDICADOR	FUNCIONALIDADE / CODFIN	CÓDIGO INTERNO (IM)	DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA ESTIMADA DE TÉRMINO	2025				
						1ºQ	2ºQ	3ºQ		
139	EE	Em execução	ATM	ATM99056	24.050	ATUALIZAÇÃO TATIC PARA ATIVAÇÃO CPV E INTEGRAÇÃO SATURNO LOCALIDADES: DIVERSAS	20/02/2028		•	•
140	EE	Em execução	ATM	ATM99057	24.051	IMPLANTAR TATIC AFIS LOCALIDADES: DIVERSAS	08/12/2027			•
141	EE	Em execução	ATM	ATM08006	25.004	IMPLANTAR SAGITARIO NO STVD DO APP-AN LOCALIDADES: ANÁPOLIS	22/10/2028		•	•
142	EE	Em execução	LOG	LOG10061	25.005	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA DO STVD SAGITARIO DO APP-CY LOCALIDADES: CUIABÁ	22/06/2029		•	•
143	EE	Em execução	LOG	LOG10061	25.006	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA DO STVD SAGITARIO DO APP-PV LOCALIDADES: PORTO VELHO	09/03/2029		•	•
144	EE	Em execução	LOG	LOG10061	25.007	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA DO STVD SAGITARIO DO APP-SV LOCALIDADES: SALVADOR	05/02/2029		•	•
145	EE	Em execução	ATM	ATM99055	25.008	ATUALIZAR SAGITARIO FASE 5 LOCALIDADES: DIVERSAS	21/02/2031		•	•
146	EE	Em execução	MET	MET06034	25.009	IMPLANTAR EMA-A (AUTOMÁTICA) NA LOCALIDADE DE CANOAS/RS LOCALIDADES: CANOAS	21/05/2026			•
147	EE	Em execução	NAV	NAV04033	25.011	RELOCAR GLIDE SLOPE DA PISTA 11R DE BRASÍLIA LOCALIDADES: BRASÍLIA	28/06/2027			•
148	EE	Em execução	NAV	NAV04040	25.012	SUBSTITUIR GLIDE - PORTO ALEGRE LOCALIDADES: PORTO ALEGRE	03/05/2027			•
149	EE	Em execução	VIG	VIG05021	25.014	IMPLANTAR RADAR DA TERMINAL PORTO ALEGRE - PRIMARIO E SECUNDARIO LOCALIDADES: CANOAS	29/10/2028			•
150	IN	Interrompido	ATM	ATM07232	25.022	IMPLANTAR NOVAS INSTALAÇÕES PARA O DTCEA/TWR/APP ANÁPOLIS LOCALIDADES: ANÁPOLIS	30/11/2029		•	
151	EE	Em execução	LOG	LOG07007	25.023	PROVER SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERMANENTE E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TI AO DECEA E OM SUBORDINADAS LOCALIDADES: BRASÍLIA; RECIFE; SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; MANAUS; GERAL; SÃO PAULO; RIO DE JANEIRO; FLORIANÓPOLIS	14/03/2026		•	•
152	EE	Em execução	NAV	NAV04042	25.024	IMPLANTAR ILS CAT I EM LONDRINA (SBLO) LOCALIDADES: LONDRINA	09/05/2026			•
153	EE	Em execução	NAV	NAV04034	25.025	SUBSTITUIR ILS (INSTRUMENT LANDING SYSTEM) LOCALIDADES: CONFINS, SANTA MARIA, SALVADOR, RIO BRANCO, CONGONHAS, SÃO LUÍS, PIRASSUNUNGA, NATAL	27/08/2027			•
154	EE	Em execução	LOG	LOG10059	25.027	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA DO STVD SAGITARIO DO ACC-AO LOCALIDADES: RECIFE	16/03/2029			•
155	EE	Em execução	LOG	LOG10059	25.028	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA DO STVD SAGITARIO DO ACC-AZ LOCALIDADES: MANAUS	08/12/2028			•
156	EE	Em execução	LOG	LOG10059	25.029	MODERNIZAÇÃO DE HW DO STVD ACC - CW LOCALIDADES: CURITIBA	16/03/2029			•
157	EE	Em execução	LOG	LOG10059	25.030	MODERNIZAÇÃO DE HW DO STVD ACC - RE LOCALIDADES: RECIFE	09/01/2029			•
158	EE	Em execução	LOG	LOG10061	25.031	MODERNIZAÇÃO DE HW DO STVD APP-RJ LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	07/12/2028			•
159	EE	Em execução	LOG	LOG10072	25.033	IMPLANTAR SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE SENSORES DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBJETOS ESPACIAIS (SMOE) LOCALIDADES: BRASÍLIA	12/09/2027			•
160	EE	Em execução	MET	MET07055	25.034	IMPLANTAR EMS-A PARA A SAC LOCALIDADES: DIVERSAS	27/02/2031			•
161	EE	Em execução	ATM	ATM11007	25.035	IMPLANTAR MÓDULO TARIFAÇÃO DO TATIC LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	24/01/2029			•
162	CC	Concluído	TEL	TEL02004	10.005 (b)	IMPLANTAR REDE ATN - BR (FASE 3) LOCALIDADES: CANGUÇU; SANTIAGO; MOSSORÓ; PONTA PORÁ; SANTA MARIA; NATAL; CURITIBA; SRPV-SP; JARAGUARI; SALVADOR; CRATÉUS; RECIFE; BONITO; FORTALEZA; FERNANDO DE NORONHA; MORRO DO URUCUM; JUAZEIRO DO NORTE; PARANAÍBA; SANTOS; DTCEATM-RJ; CANOAS; CORRENTE; PORTO ALEGRE; PORTO MURTINHO; GUARAPUAVA; ARACAJU; BOM JESUS DA LAPA; PASSO FUNDO; MORRO DA IGREJA; COXIM; ASSIS; SÃO FRANCISCO DO SUL; PATOS; ILHÉUS; TERESINA; FLORIANO; FLORIANÓPOLIS; VITÓRIA DA CONQUISTA; NAVEGANTES; SÃO RAIMUNDO NONATO; PORTO SEGURO; BARREIRAS; CAMPO GRANDE; PAULO AFONSO; LOANDA; TRÊS LAGOAS; PETROLINA; FOZ DO IGUAÇU; CATANDUVAS; MACEIÓ	24/06/2025	•	•	
163	CC	Concluído	TEL	TEL02004	10.005 (c)	IMPLANTAR SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) E BACKBONE DE COMUNICAÇÃO OPERACIONAL (PFF042) LOCALIDADES: BRASÍLIA; MANAUS; CURITIBA; SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; RIO DE JANEIRO; CONGONHAS; RECIFE	05/05/2025	•	•	
164	EE	Em execução	TEL	TEL02004	10.005 (d)	IMPLANTAR REDE ATN - FASE 4 (PFF042) LOCALIDADES: RECIFE; PORTO SEGURO; CAMPO DOS AFONSOS; SUMARÉ; TEÓFILO OTONI; TRÊS MARIAS; CAMPO DE MARTE; JOÃO PESSOA; GUARATINGUETÁ; SALESÓPOLIS; CUNHA; SÃO PEDRO DA ALDEIA; LONDRINA; GUARULHOS; SANTA CRUZ; NATAL; MACEIÓ; CAMPO GRANDE; CURITIBA; SANTOS; FORTALEZA; FOZ DO IGUAÇU; SALVADOR; PORTO ALEGRE; SANTA MARIA; FLORIANÓPOLIS; CANOAS; CAXIAS DO SUL; ARAPONGAS; SÃO PAULO; GALEÃO; SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; MOMBACA	11/10/2027	•	•	•
165	EE	Em execução	ATM	ATM99064	17.061 (b)	ADQUIRIR LICENÇA DO INO - EUROCONTROL (PFF017) LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	02/03/2027	•	•	•
166	IN	Interrompido	TEL	TEL11010	24.034 (v2)	SUBSTITUIÇÃO DE 5 CENTRAIS DE AUDIO DO SISCEAB LOCALIDADES: MANAUS; ANÁPOLIS; SÃO GONÇALO DO AMARANTE; CUIABÁ; PIRASSUNUNGA	24/08/2027		•	
167	IN	Interrompido	TEL	TEL08031	24.046 (Antigo)	AMPLIAR A ATN-BR NO CINDACTA IV E EM SEUS SÍTIOS DE INTERESSE OPERACIONAL LOCALIDADES: DIVERSAS	12/01/2031			•

ANEXO A - PROJETOS DO PROGRAMA DE TRABALHO
 JANEIRO A DEZEMBRO/2025
 TP002/CISCEA/2023

ITEM	INDICADOR	FUNCIONALIDADE / CODFIN	CÓDIGO INTERNO (IM)	DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA ESTIMADA DE TÉRMINO	2025				
						1ºQ	2ºQ	3ºQ		
168	IN	Interrompido	ATM	ATM99056	24.051 (antigo)	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TATIC AFIS LOCALIDADES: DIVERSAS	11/11/2026		•	•
169	EE	Em execução	RHU	RHU99016	PLS. CISCEA	ATENDER AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE A SEREM DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO DECEA E OM SUBORDINADAS LOCALIDADES: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; MANAUS; BRASÍLIA; RECIFE; DIVERSAS. RIO DE JANEIRO; CURITIBA; SÃO PAULO	27/01/2027		•	•
170	CC	Concluído	RHU	RHU99016	PLS. CISCEA	IMPLANTAR PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTAVEL (PLS) - NO ÂMBITO DA CISCEA LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO	28/02/2025	•		

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TP002/DECEA/CTCEA/2023 EXERCÍCIO 2025		
Número CTCEA: RT066/26		Pág.: 1/3
Rev: 00	Distribuição: SDAD, Presidente da Comissão de Avaliação, Representante CTCEA da Comissão de Avaliação, ACAP.	Data: 26/01/2026

1 OBJETIVO

Apresentar a execução física das atividades da CTCEA, constantes no Termo de Parceria nº 002/DECEA/CTCEA/2023, referentes ao período de 1º. de Janeiro de 2025 a 31 de Dezembro de 2025.

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Termo de Parceria nº 002/DECEA/CTCEA/2023.
- 1º Termo de Ajuste ao Termo de Parceria No. 002/DECEA/CTCEA/2023.

3 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

O Termo de Parceria Nº 002/DECEA/CTCEA/2023 com vigência a partir de 1º. de Setembro de 2023 tem duração de 5 (cinco anos). Seu Programa de Trabalho foi constituído de 600 produtos.

Desde então foi firmado um Termo de Ajuste ao Termo de Parceria, discriminado abaixo:

- 1º Termo de Ajuste, datado de 23/05/2024, cuja finalidade foi promover modificações, necessárias e indispensáveis, no Instrumento Jurídico do Termo de Parceria, bem como no Anexo A – Programa de Trabalho do Anexo 12 – Metodologia de Avaliação de Desempenho.

A seguir, é apresentado o cenário da Parceria em Dezembro de 2025, considerando o quantitativo dos produtos em curso.

Cenário em Dezembro/25	
Produtos do TP	600
Produtos Extra-TP	0
Produtos Concluídos	280
Produtos Cancelados	0
Produtos Não-Iniciados	320
Produtos Parados	0
Produtos Em Andamento	0



RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES
TP002/DECEA/CTCEA/2023
EXERCÍCIO 2025

Número CTCEA: RT066/26

Pág.: 2/3

O Anexo A deste Relatório apresenta a Realização Física dos Produtos estabelecidos no Termo de Parceria referente ao período analisado. Conforme verificado, é possível identificar o desenvolvimento físico de 100% do Previsto no Programa de Trabalho acordado.

Tendo em vista a previsão do Anexo 12 (Metodologia de Avaliação de Desempenho do Termo de Parceria), o quadro a seguir apresenta o comparativo da quantidade de produtos previstos e realizados e os resultados alcançados ao longo de 2025.

PERÍODO	PRODUTOS (2025)		PRODUTOS (Acumulado TP)		N1	N2	NG
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
JAN-ABR/2025	40	40	200	200	10,00	10,00	10,00
MAI-AGO/2025	40	40	240	240	10,00	10,00	10,00
SET-DEZ/2025 (*)	40	40	280	280	-	-	-

Fonte: 5º Relatório da Comissão de Avaliação – Período: 1º. Quadrimestre de 2025, de 09/06/2025
6º Relatório da Comissão de Avaliação – Período: 2º. Quadrimestre de 2025, de 16/10/2025

(*) O 7º. Relatório da Comissão de Avaliação, que tem como data de finalização até o dia 20/02/26, ainda não foi elaborado em função das datas contidas no Anexo 12 (Metodologia de Avaliação de Desempenho do Termo de Parceria).

4 ANEXO

Anexo A – Realização Física dos Produtos estabelecidos no Termo de Parceria – Exercício 2025.

5 CONCLUSÃO

Diante do apresentado neste Relatório, segue a síntese do Desempenho dos quadrimestres do exercício de 2025:

➤ 1º Quadrimestre de 2025 (JAN-ABR/2025)

- Nota da Avaliação Quantitativa (N₁) – 10,00
- Nota da Avaliação Qualitativa (N₂) – 10,00
- Nota Geral da Avaliação de Desempenho Quadrimestral (NG) – 10,00
- Desempenho Geral do Quadrimestre: **EXCELENTE**.

Fonte: 5º Relatório da Comissão de Avaliação – Período: 1º. Quadrimestre de 2025, de 09/06/2025

➤ 2º Quadrimestre de 2025 (MAI-AGO/2025)

- Nota da Avaliação Quantitativa (N₁) – 10,00
- Nota da Avaliação Qualitativa (N₂) – 10,00
- Nota Geral da Avaliação de Desempenho Quadrimestral (NG) – 10,00

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES
TP002/DECEA/CTCEA/2023
EXERCÍCIO 2025

Número CTCEA: RT066/26

Pág.: 3/3

- Desempenho Geral do Quadrimestre: **EXCELENTE**.

Fonte: 6º Relatório da Comissão de Avaliação – Período: 2º. Quadrimestre de 2025, de 16/10/2025

➤ **3º Quadrimestre de 2025 (SET-DEZ/2025) (*)**

- Nota da Avaliação Quantitativa (N₁) –
- Nota da Avaliação Qualitativa (N₂) –
- Nota Geral da Avaliação de Desempenho Quadrimestral (NG) –
- Desempenho Geral do Quadrimestre: –

(*) O 7º Relatório da Comissão de Avaliação, que tem como data de finalização até o dia 20/02/26, ainda não foi elaborado em função das datas contidas no Anexo 12 (Metodologia de Avaliação de Desempenho do Termo de Parceria).

Por fim, os 120 produtos previstos para o exercício de 2025 foram entregues nos prazos estabelecidos. Como consequência, a Execução física alcançou 100% do Previsto no Termo de Parceria nº 002/DECEA/CTCEA/2023.

Elaboração	Verificação	Aprovação
MICHEL COSTA ALCANTARA: 108110814513786 Assinado de forma digital por MICHEL COSTA ALCANTARA:10814513786 Dados: 2026.01.26 11:27:56 -03'00'	GEOVANI DE SOUZA BORGES:08370963676 Assinado de forma digital por GEOVANI DE SOUZA BORGES:08370963676 Dados: 2026.01.26 11:33:01 -03'00'	Documento Assinado Digitalmente por CN=JOSE ROBERTO MOURA DA SILVA:63629445772, OU=presencial, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=12517704000115, O=ICP-Brasil, C=BR Data: 2026.01.27 10:01:20 -03:00 Razão: Segurança Local: JOSEROBERTO-PC

Anexo A

Realização Física dos Produtos estabelecidos no Termo de Parceria

Exercício 2025

Item	Produto	Data Início Prevista	Data Término Prevista	Progresso Previsto	Progresso Atual
1	A01 - Garantir a operacionalização do Sistema de Gestão de Tarifas.	01/01/2025	30/04/2025	100%	100%
2	A01 - Garantir a operacionalização do Sistema de Gestão de Tarifas.	01/05/2025	31/08/2025	100%	100%
3	A01 - Garantir a operacionalização do Sistema de Gestão de Tarifas.	01/09/2025	31/12/2025	100%	100%
4	A02 - Desenvolver e implantar novas tecnologias e aprimorar às já existentes no Sistema de Tarifas de Navegação Aérea.	01/01/2025	31/01/2025	100%	100%
5	A02 - Desenvolver e implantar novas tecnologias e aprimorar às já existentes no Sistema de Tarifas de Navegação Aérea.	01/02/2025	28/02/2025	100%	100%
6	A02 - Desenvolver e implantar novas tecnologias e aprimorar às já existentes no Sistema de Tarifas de Navegação Aérea.	01/03/2025	31/03/2025	100%	100%
7	A02 - Desenvolver e implantar novas tecnologias e aprimorar às já existentes no Sistema de Tarifas de Navegação Aérea.	01/04/2025	30/04/2025	100%	100%
8	A02 - Desenvolver e implantar novas tecnologias e aprimorar às já existentes no Sistema de Tarifas de Navegação Aérea.	01/05/2025	31/05/2025	100%	100%
9	A02 - Desenvolver e implantar novas tecnologias e aprimorar às já existentes no Sistema de Tarifas de Navegação Aérea.	01/06/2025	30/06/2025	100%	100%
10	A02 - Desenvolver e implantar novas tecnologias e aprimorar às já existentes no Sistema de Tarifas de Navegação Aérea.	01/07/2025	31/07/2025	100%	100%
11	A02 - Desenvolver e implantar novas tecnologias e aprimorar às já existentes no Sistema de Tarifas de Navegação Aérea.	01/08/2025	31/08/2025	100%	100%
12	A02 - Desenvolver e implantar novas tecnologias e aprimorar às já existentes no Sistema de Tarifas de Navegação Aérea.	01/09/2025	30/09/2025	100%	100%
13	A02 - Desenvolver e implantar novas tecnologias e aprimorar às já existentes no Sistema de Tarifas de Navegação Aérea.	01/10/2025	31/10/2025	100%	100%
14	A02 - Desenvolver e implantar novas tecnologias e aprimorar às já existentes no Sistema de Tarifas de Navegação Aérea.	01/11/2025	30/11/2025	100%	100%

Item	Produto	Data Início Prevista	Data Término Prevista	Progresso Previsto	Progresso Atual
15	A02 - Desenvolver e implantar novas tecnologias e aprimorar às já existentes no Sistema de Tarifas de Navegação Aérea.	01/12/2025	31/12/2025	100%	100%
16	A03 - Manutenção dos sistemas utilizados na Gestão de Tarifas de Navegação Aérea.	01/01/2025	31/01/2025	100%	100%
17	A03 - Manutenção dos sistemas utilizados na Gestão de Tarifas de Navegação Aérea.	01/02/2025	28/02/2025	100%	100%
18	A03 - Manutenção dos sistemas utilizados na Gestão de Tarifas de Navegação Aérea.	01/03/2025	31/03/2025	100%	100%
19	A03 - Manutenção dos sistemas utilizados na Gestão de Tarifas de Navegação Aérea.	01/04/2025	30/04/2025	100%	100%
20	A03 - Manutenção dos sistemas utilizados na Gestão de Tarifas de Navegação Aérea.	01/05/2025	31/05/2025	100%	100%
21	A03 - Manutenção dos sistemas utilizados na Gestão de Tarifas de Navegação Aérea.	01/06/2025	30/06/2025	100%	100%
22	A03 - Manutenção dos sistemas utilizados na Gestão de Tarifas de Navegação Aérea.	01/07/2025	31/07/2025	100%	100%
23	A03 - Manutenção dos sistemas utilizados na Gestão de Tarifas de Navegação Aérea.	01/08/2025	31/08/2025	100%	100%
24	A03 - Manutenção dos sistemas utilizados na Gestão de Tarifas de Navegação Aérea.	01/09/2025	30/09/2025	100%	100%
25	A03 - Manutenção dos sistemas utilizados na Gestão de Tarifas de Navegação Aérea.	01/10/2025	31/10/2025	100%	100%
26	A03 - Manutenção dos sistemas utilizados na Gestão de Tarifas de Navegação Aérea.	01/11/2025	30/11/2025	100%	100%
27	A03 - Manutenção dos sistemas utilizados na Gestão de Tarifas de Navegação Aérea.	01/12/2025	31/12/2025	100%	100%
28	A04 - Garantir a operacionalização dos sistemas de coleta dos movimentos de tráfego aéreo.	01/01/2025	31/01/2025	100%	100%
29	A04 - Garantir a operacionalização dos sistemas de coleta dos movimentos de tráfego aéreo.	01/02/2025	28/02/2025	100%	100%
30	A04 - Garantir a operacionalização dos sistemas de coleta dos movimentos de tráfego aéreo.	01/03/2025	31/03/2025	100%	100%
31	A04 - Garantir a operacionalização dos sistemas de coleta dos movimentos de tráfego aéreo.	01/04/2025	30/04/2025	100%	100%
32	A04 - Garantir a operacionalização dos sistemas de coleta dos movimentos de tráfego aéreo.	01/05/2025	31/05/2025	100%	100%
33	A04 - Garantir a operacionalização dos sistemas de coleta dos movimentos de tráfego aéreo.	01/06/2025	30/06/2025	100%	100%

Item	Produto	Data Início Prevista	Data Término Prevista	Progresso Previsto	Progresso Atual
34	A04 - Garantir a operacionalização dos sistemas de coleta dos movimentos de tráfego aéreo.	01/07/2025	31/07/2025	100%	100%
35	A04 - Garantir a operacionalização dos sistemas de coleta dos movimentos de tráfego aéreo.	01/08/2025	31/08/2025	100%	100%
36	A04 - Garantir a operacionalização dos sistemas de coleta dos movimentos de tráfego aéreo.	01/09/2025	30/09/2025	100%	100%
37	A04 - Garantir a operacionalização dos sistemas de coleta dos movimentos de tráfego aéreo.	01/10/2025	31/10/2025	100%	100%
38	A04 - Garantir a operacionalização dos sistemas de coleta dos movimentos de tráfego aéreo.	01/11/2025	30/11/2025	100%	100%
39	A04 - Garantir a operacionalização dos sistemas de coleta dos movimentos de tráfego aéreo.	01/12/2025	31/12/2025	100%	100%
40	A05 - Análise e solução das pendências dos Movimentos de Tráfego Aéreo coletados e não faturados.	01/01/2025	31/01/2025	100%	100%
41	A05 - Análise e solução das pendências dos Movimentos de Tráfego Aéreo coletados e não faturados.	01/02/2025	28/02/2025	100%	100%
42	A05 - Análise e solução das pendências dos Movimentos de Tráfego Aéreo coletados e não faturados.	01/03/2025	31/03/2025	100%	100%
43	A05 - Análise e solução das pendências dos Movimentos de Tráfego Aéreo coletados e não faturados.	01/04/2025	30/04/2025	100%	100%
44	A05 - Análise e solução das pendências dos Movimentos de Tráfego Aéreo coletados e não faturados.	01/05/2025	31/05/2025	100%	100%
45	A05 - Análise e solução das pendências dos Movimentos de Tráfego Aéreo coletados e não faturados.	01/06/2025	30/06/2025	100%	100%
46	A05 - Análise e solução das pendências dos Movimentos de Tráfego Aéreo coletados e não faturados.	01/07/2025	31/07/2025	100%	100%
47	A05 - Análise e solução das pendências dos Movimentos de Tráfego Aéreo coletados e não faturados.	01/08/2025	31/08/2025	100%	100%
48	A05 - Análise e solução das pendências dos Movimentos de Tráfego Aéreo coletados e não faturados.	01/09/2025	30/09/2025	100%	100%
49	A05 - Análise e solução das pendências dos Movimentos de Tráfego Aéreo coletados e não faturados.	01/10/2025	31/10/2025	100%	100%

Item	Produto	Data Início Prevista	Data Término Prevista	Progresso Previsto	Progresso Atual
50	A05 - Análise e solução das pendências dos Movimentos de Tráfego Aéreo coletados e não faturados.	01/11/2025	30/11/2025	100%	100%
51	A05 - Análise e solução das pendências dos Movimentos de Tráfego Aéreo coletados e não faturados.	01/12/2025	31/12/2025	100%	100%
52	A06 - Garantir a agilidade no atendimento às solicitações de revisão de cobrança realizadas pelos usuários das Tarifas de Auxílio a Navegação Aérea.	01/01/2025	31/01/2025	100%	100%
53	A06 - Garantir a agilidade no atendimento às solicitações de revisão de cobrança realizadas pelos usuários das Tarifas de Auxílio a Navegação Aérea.	01/02/2025	28/02/2025	100%	100%
54	A06 - Garantir a agilidade no atendimento às solicitações de revisão de cobrança realizadas pelos usuários das Tarifas de Auxílio a Navegação Aérea.	01/03/2025	31/03/2025	100%	100%
55	A06 - Garantir a agilidade no atendimento às solicitações de revisão de cobrança realizadas pelos usuários das Tarifas de Auxílio a Navegação Aérea.	01/04/2025	30/04/2025	100%	100%
56	A06 - Garantir a agilidade no atendimento às solicitações de revisão de cobrança realizadas pelos usuários das Tarifas de Auxílio a Navegação Aérea.	01/05/2025	31/05/2025	100%	100%
57	A06 - Garantir a agilidade no atendimento às solicitações de revisão de cobrança realizadas pelos usuários das Tarifas de Auxílio a Navegação Aérea.	01/06/2025	30/06/2025	100%	100%
58	A06 - Garantir a agilidade no atendimento às solicitações de revisão de cobrança realizadas pelos usuários das Tarifas de Auxílio a Navegação Aérea.	01/07/2025	31/07/2025	100%	100%
59	A06 - Garantir a agilidade no atendimento às solicitações de revisão de cobrança realizadas pelos usuários das Tarifas de Auxílio a Navegação Aérea.	01/08/2025	31/08/2025	100%	100%
60	A06 - Garantir a agilidade no atendimento às solicitações de revisão de cobrança realizadas pelos usuários das Tarifas de Auxílio a Navegação Aérea.	01/09/2025	30/09/2025	100%	100%
61	A06 - Garantir a agilidade no atendimento às solicitações de revisão de cobrança realizadas pelos usuários das Tarifas de Auxílio a Navegação Aérea.	01/10/2025	31/10/2025	100%	100%
62	A06 - Garantir a agilidade no atendimento às solicitações de revisão de cobrança realizadas	01/11/2025	30/11/2025	100%	100%

Item	Produto	Data Início Prevista	Data Término Prevista	Progresso Previsto	Progresso Atual
	pelos usuários das Tarifas de Auxílio a Navegação Aérea.				
63	A06 - Garantir a agilidade no atendimento às solicitações de revisão de cobrança realizadas pelos usuários das Tarifas de Auxílio a Navegação Aérea.	01/12/2025	31/12/2025	100%	100%
64	A07 - Acompanhamento da inadimplência e aplicação dos procedimentos previstos na Legislação.	01/01/2025	31/01/2025	100%	100%
65	A07 - Acompanhamento da inadimplência e aplicação dos procedimentos previstos na Legislação.	01/02/2025	28/02/2025	100%	100%
66	A07 - Acompanhamento da inadimplência e aplicação dos procedimentos previstos na Legislação.	01/03/2025	31/03/2025	100%	100%
67	A07 - Acompanhamento da inadimplência e aplicação dos procedimentos previstos na Legislação.	01/04/2025	30/04/2025	100%	100%
68	A07 - Acompanhamento da inadimplência e aplicação dos procedimentos previstos na Legislação.	01/05/2025	31/05/2025	100%	100%
69	A07 - Acompanhamento da inadimplência e aplicação dos procedimentos previstos na Legislação.	01/06/2025	30/06/2025	100%	100%
70	A07 - Acompanhamento da inadimplência e aplicação dos procedimentos previstos na Legislação.	01/07/2025	31/07/2025	100%	100%
71	A07 - Acompanhamento da inadimplência e aplicação dos procedimentos previstos na Legislação.	01/08/2025	31/08/2025	100%	100%
72	A07 - Acompanhamento da inadimplência e aplicação dos procedimentos previstos na Legislação.	01/09/2025	30/09/2025	100%	100%
73	A07 - Acompanhamento da inadimplência e aplicação dos procedimentos previstos na Legislação.	01/10/2025	31/10/2025	100%	100%
74	A07 - Acompanhamento da inadimplência e aplicação dos procedimentos previstos na Legislação.	01/11/2025	30/11/2025	100%	100%
75	A07 - Acompanhamento da inadimplência e aplicação dos procedimentos previstos na Legislação.	01/12/2025	31/12/2025	100%	100%
76	A08 - Acompanhamento e manutenção dos acordos de cobrança firmados pelo Parceiro Público.	01/01/2025	31/01/2025	100%	100%
77	A08 - Acompanhamento e manutenção dos acordos de cobrança firmados pelo Parceiro Público.	01/02/2025	28/02/2025	100%	100%

Item	Produto	Data Início Prevista	Data Término Prevista	Progresso Previsto	Progresso Atual
78	A08 - Acompanhamento e manutenção dos acordos de cobrança firmados pelo Parceiro Público.	01/03/2025	31/03/2025	100%	100%
79	A08 - Acompanhamento e manutenção dos acordos de cobrança firmados pelo Parceiro Público.	01/04/2025	30/04/2025	100%	100%
80	A08 - Acompanhamento e manutenção dos acordos de cobrança firmados pelo Parceiro Público.	01/05/2025	31/05/2025	100%	100%
81	A08 - Acompanhamento e manutenção dos acordos de cobrança firmados pelo Parceiro Público.	01/06/2025	30/06/2025	100%	100%
82	A08 - Acompanhamento e manutenção dos acordos de cobrança firmados pelo Parceiro Público.	01/07/2025	31/07/2025	100%	100%
83	A08 - Acompanhamento e manutenção dos acordos de cobrança firmados pelo Parceiro Público.	01/08/2025	31/08/2025	100%	100%
84	A08 - Acompanhamento e manutenção dos acordos de cobrança firmados pelo Parceiro Público.	01/09/2025	30/09/2025	100%	100%
85	A08 - Acompanhamento e manutenção dos acordos de cobrança firmados pelo Parceiro Público.	01/10/2025	31/10/2025	100%	100%
86	A08 - Acompanhamento e manutenção dos acordos de cobrança firmados pelo Parceiro Público.	01/11/2025	30/11/2025	100%	100%
87	A08 - Acompanhamento e manutenção dos acordos de cobrança firmados pelo Parceiro Público.	01/12/2025	31/12/2025	100%	100%
88	A09 - Garantir a identificação dos valores arrecadados e sua efetiva distribuição conforme previsto na Legislação.	01/01/2025	30/04/2025	100%	100%
89	A09 - Garantir a identificação dos valores arrecadados e sua efetiva distribuição conforme previsto na Legislação.	01/05/2025	31/08/2025	100%	100%
90	A09 - Garantir a identificação dos valores arrecadados e sua efetiva distribuição conforme previsto na Legislação.	01/09/2025	31/12/2025	100%	100%
91	A10 - Análise e solução das pendências de cadastro utilizado como base do faturamento dos movimentos de tráfego aéreo coletados.	01/01/2025	30/04/2025	100%	100%
92	A10 - Análise e solução das pendências de cadastro utilizado como base do faturamento dos movimentos de tráfego aéreo coletados.	01/05/2025	31/08/2025	100%	100%
93	A10 - Análise e solução das pendências de cadastro utilizado como base do faturamento dos movimentos de tráfego aéreo coletados.	01/09/2025	31/12/2025	100%	100%

Item	Produto	Data Início Prevista	Data Término Prevista	Progresso Previsto	Progresso Atual
94	A11 - Garantir as informações necessárias suportando a tomada de decisão do Parceiro Público na gestão do Sistema de Tarifação.	01/01/2025	30/04/2025	100%	100%
95	A11 - Garantir as informações necessárias suportando a tomada de decisão do Parceiro Público na gestão do Sistema de Tarifação.	01/05/2025	31/08/2025	100%	100%
96	A11 - Garantir as informações necessárias suportando a tomada de decisão do Parceiro Público na gestão do Sistema de Tarifação.	01/09/2025	31/12/2025	100%	100%
97	A12 - Garantir o processamento de todas as informações de custo coletadas do SISCEAB.	01/01/2025	30/04/2025	100%	100%
98	A12 - Garantir o processamento de todas as informações de custo coletadas do SISCEAB.	01/05/2025	31/08/2025	100%	100%
99	A12 - Garantir o processamento de todas as informações de custo coletadas do SISCEAB.	01/09/2025	31/12/2025	100%	100%
100	A13 - Garantir a agilidade e a qualidade no suporte aos usuários do SISCEAB.	01/01/2025	31/01/2025	100%	100%
101	A13 - Garantir a agilidade e a qualidade no suporte aos usuários do SISCEAB.	01/02/2025	28/02/2025	100%	100%
102	A13 - Garantir a agilidade e a qualidade no suporte aos usuários do SISCEAB.	01/03/2025	31/03/2025	100%	100%
103	A13 - Garantir a agilidade e a qualidade no suporte aos usuários do SISCEAB.	01/04/2025	30/04/2025	100%	100%
104	A13 - Garantir a agilidade e a qualidade no suporte aos usuários do SISCEAB.	01/05/2025	31/05/2025	100%	100%
105	A13 - Garantir a agilidade e a qualidade no suporte aos usuários do SISCEAB.	01/06/2025	30/06/2025	100%	100%
106	A13 - Garantir a agilidade e a qualidade no suporte aos usuários do SISCEAB.	01/07/2025	31/07/2025	100%	100%
107	A13 - Garantir a agilidade e a qualidade no suporte aos usuários do SISCEAB.	01/08/2025	31/08/2025	100%	100%
108	A13 - Garantir a agilidade e a qualidade no suporte aos usuários do SISCEAB.	01/09/2025	30/09/2025	100%	100%
109	A13 - Garantir a agilidade e a qualidade no suporte aos usuários do SISCEAB.	01/10/2025	31/10/2025	100%	100%
110	A13 - Garantir a agilidade e a qualidade no suporte aos usuários do SISCEAB.	01/11/2025	30/11/2025	100%	100%
111	A13 - Garantir a agilidade e a qualidade no suporte aos usuários do SISCEAB.	01/12/2025	31/12/2025	100%	100%
112	A14 - Garantir o encaminhamento e a conformidade dos processos de cobrança direcionados a PGFN conforme determinação do Parceiro Público.	01/01/2025	30/04/2025	100%	100%
113	A14 - Garantir o encaminhamento e a conformidade dos processos de cobrança direcionados a PGFN conforme determinação do Parceiro Público.	01/05/2025	31/08/2025	100%	100%

Item	Produto	Data Início Prevista	Data Término Prevista	Progresso Previsto	Progresso Atual
114	A14 - Garantir o encaminhamento e a conformidade dos processos de cobrança direcionados a PGFN conforme determinação do Parceiro Público.	01/09/2025	31/12/2025	100%	100%
115	A15 - Garantir o encaminhamento e a conformidade dos processos de cobrança direcionados a JJAER conforme determinação do Parceiro Público.	01/01/2025	30/04/2025	100%	100%
116	A15 - Garantir o encaminhamento e a conformidade dos processos de cobrança direcionados a JJAER conforme determinação do Parceiro Público.	01/05/2025	31/08/2025	100%	100%
117	A15 - Garantir o encaminhamento e a conformidade dos processos de cobrança direcionados a JJAER conforme determinação do Parceiro Público.	01/09/2025	31/12/2025	100%	100%
118	A16 - Garantir a qualidade e a confiabilidade da gestão do Sistema de Tarifação.	01/01/2025	30/04/2025	100%	100%
119	A16 - Garantir a qualidade e a confiabilidade da gestão do Sistema de Tarifação.	01/05/2025	31/08/2025	100%	100%
120	A16 - Garantir a qualidade e a confiabilidade da gestão do Sistema de Tarifação.	01/09/2025	31/12/2025	100%	100%
TOTAL DE PRODUTOS PREVISTOS					120
TOTAL DE PRODUTOS REALIZADOS					120

Elaboração	Verificação	Aprovação
<p>MICHEL COSTA ALCANTARA: 1081 1081451378 6</p> <p>Assinado de forma digital por MICHEL COSTA ALCANTARA:1081 4513786 Dados: 2026.01.26 11:16:01 -03'00'</p>	<p>GEOVANI DE SOUZA BORGES:0 83709636 76</p> <p>Assinado de forma digital por GEOVANI DE SOUZA BORGES:0837096 3676 Dados: 2026.01.26 11:33:34 -03'00'</p>	<p>Documento Assinado Digitalmente por CN=JOSE ROBERTO MOURA DA SILVA:63629445772, OU=presencial, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=12517704000115, O=ICP-Brasil, C=BR Data: 2026.01.27 10:05:28 -03:00 Razão: Segurança Local: JOSEROBERTO-PC</p>



ANEXO B

Balancos Patrimoniais

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício 2025



BALANÇOS PATRIMONIAIS
Levantados em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em reais - centavos omitidos)

ATIVO

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
CIRCULANTE:		
Caixa e equivalente de caixa (Nota 4)	163.505.455	197.703.684
Caixa e bancos	42.599	9.900
Aplicações financeiras	163.462.856	197.693.784
Termos de parceria (Nota 5)	129.790.999	112.925.228
Termos de parceria firmados a faturar	129.790.999	112.925.228
Termos de parceria a receber	-	-
Adiantamento a empregados	655.351	51.860
Almoxarifado	26.849	23.112
Outros Créditos	4.341	4.488
Despesas antecipadas	1.739.760	1.695.676
Total do Circulante	295.722.755	312.404.048
NÃO CIRCULANTE:		
Realizável a Longo Prazo:		
Termo de parceria a faturar (Nota 5)	707.950.473	853.881.807
Imobilizado vinculado a Terceiros (Nota 6)	1.274.483	819.258
Intangível vinculado a Terceiros (Nota 7)	-	368
Total do não Circulante	709.224.956	854.701.433
Total do Ativo	1.004.947.711	1.167.105.481

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
CIRCULANTE:		
Fornecedores	236.178	195.686
Recursos Projetos a Executar do TP	110.437.010	148.107.695
Impostos e contribuições a recolher	2.177.167	1.983.535
Salários e encargos sociais	2.950.336	2.835.406
Férias a pagar	9.661.848	11.397.808
Receitas de termo de parceria a apropriar	129.790.999	112.925.228
Outras contas a pagar	227.937	186.949
Total do Circulante	255.481.475	277.632.307
NÃO CIRCULANTE:		
Receitas de termo de parceria a apropriar (Nota 5)	707.950.473	853.881.807
Recursos vinculados a Dep. Judicial de Atualiz. Monetária	-	-
Recursos de Provisões vinculados aos TP'S	15.005.837	10.994.805
Obrigações com Terceiros Imobilizado/Intangível (Nota 6 e 7)	1.274.483	819.626
Provisões para contingências (Nota 8)	25.233.443	23.774.936
Total do não Circulante	749.464.236	889.471.174
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		
Patrimônio Social (Nota 9)	2.000	2.000
Total do Patrimônio Líquido	2.000	2.000
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	1.004.947.711	1.167.105.481

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



ANEXO C

Demonstrações de Superávits ou Déficits (Resultados do Exercício)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício 2025



DEMONSTRAÇÕES DOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS
Levantados em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em reais - centavos omitidos)

	TP 001 PAME/2020	TP 001 CCOMGEX/2021	TP 002 CISCEA/2023	TP 002 DECEA/2023	31/12/2025	31/12/2024
RECEITAS OPERACIONAIS:						
Receitas com termo de parceria	25.250.248	26.585.794	101.016.762	14.885.505	167.738.308	165.918.688
ISS	(518.795)	(1.224.930)	(3.898.083)	(811.470)	(6.453.278)	(12.111.245)
Parcelas Renunciadas de cobrança	-	-	-	-	-	-
Receita líquida com termo de parceria	24.731.453	25.360.864	97.118.679	14.074.035	161.285.030	153.807.443
Outras Receitas	-	-	971.931	457.476	1.429.408	1.758.745
Receitas financeiras, líquidas	601.766	1.633.358	4.594.959	666.439	7.496.521	6.704.525
Total das receitas operacionais	25.333.219	26.994.222	102.685.569	15.197.950	170.210.959	162.270.713
DESPESAS OPERACIONAIS:						
Despesas com pessoal	(20.113.252)	(17.008.213)	(75.891.733)	(11.180.974)	(124.194.172)	(116.592.554)
Encargos sociais	(4.237.909)	(4.126.598)	(19.114.950)	(3.162.542)	(30.641.999)	(29.949.120)
Provisões para contingências	-	(2.148.234)	(1.133.954)	(315.926)	(3.598.114)	(4.698.941)
Despesas com viagens	(126.258)	(432.693)	(2.657.753)	(62.452)	(3.279.157)	(4.026.548)
Despesas com diárias	(227.404)	(164.397)	(1.562.556)	(19.562)	(1.973.919)	(2.138.462)
Despesas administrativas	(387.674)	(2.065.377)	(1.399.274)	(209.444)	(4.061.768)	(2.289.526)
Despesas gerais	(199.031)	(972.935)	(665.282)	(243.717)	(2.080.966)	(1.184.675)
Depreciação / Amortização	(21.691)	(45.388)	(18.509)	(3.333)	(88.921)	(69.938)
Projetos	(20.000)	(30.387)	(241.558)	-	(291.945)	(1.320.949)
Outras despesas	-	-	-	-	-	-
Total Despesas Operacionais	(25.333.219)	(26.994.222)	(102.685.569)	(15.197.950)	(170.210.961)	(162.270.713)
SUPERÁVITS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (DESPESAS) INSTITUCIONAIS						
Receitas financeiras, líquidas das provisões e recursos institucionais					16.380	43.045
Depreciação / Amortização					(16.380)	(17.414)
Despesas Administrativas e Despesas Gerais Institucionais					-	(25.631)
Provisões para Contingências					-	-
Outras despesas					-	-
Total das Receitas (Despesas) Institucionais					-	-
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO					-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



ANEXO D

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício 2025



DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Levantados em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em reais - centavos omitidos)

	Patrimônio Social	Reservas constituídas	Superávits acumulados	Total
SALDO EM 31 DEZEMBRO DE 2024	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.000</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.000</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



ANEXO E

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício 2025



DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Levantados em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em reais - centavos omitidos)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS :		
Superávit do Exercício	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas (consumidas nas) atividades operacionais :		
Depreciação / Amortização	105.301	87.351
Provisões para contingências	3.598.114	4.698.940
Disponibilidades Líquidas geradas pelas operações	3.703.415	4.786.291
Pagamentos de Rescisão de Contratos (Provisão de Passivo de Obrig. Trabalhistas)	(2.139.607)	(2.553.109)
Variações nos Ativos e Passivos		
Termos de parceria	(16.865.771)	52.625.391
Adiantamento a empregados	(603.491)	104.856
Almoxarifado	(3.737)	3.598
Outros Créditos	147	(506)
Despesas antecipadas	(44.084)	(1.611.534)
Fornecedores	40.492	(124.306)
Recursos Projetos a Executar do TP	(37.670.685)	76.321.437
Impostos e contribuições a recolher	193.632	236.598
Salários e encargos sociais	114.929	249.395
Provisão para férias	(1.735.960)	873.026
Receitas de termo de parceria a apropriar	16.865.771	(52.625.392)
Outras contas a pagar	40.988	37.629
Recursos de Provisões vinculados aos TP'S	4.011.033	(4.773.894)
Obrigações com Terceiros Imobilizado/Intangível	454.857	(309.954)
Total das atividades operacionais	<u>(33.638.071)</u>	<u>73.239.528</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisições de Bens do Imobilizado	(560.158)	222.602
Disponibilidades geradas no exercício	<u>(34.198.229)</u>	<u>73.462.128</u>
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES:		
No Início do Exercício	197.703.684	124.241.556
No Fim do Exercício	163.505.455	197.703.684
Disponibilidades geradas no exercício	<u>(34.198.229)</u>	<u>73.462.128</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANEXO F

Demonstrações do Valor Adicionado

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício 2025



DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Levantados em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em reais - centavos omitidos)

	<u>31/12/2025</u>	<u>%</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>%</u>
CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO :				
Receitas com termo de parceria, líquidas	161.285.030	104	153.807.443	105
Gastos com operação do termo de parceria	(5.253.075)	(3)	(6.188.781)	(4)
Materiais, aluguéis e serviços de terceiros	(6.434.679)	(4)	(4.796.745)	(3)
Valor adicionado bruto	149.597.275	97	142.821.917	98
Depreciação / Amortização	(105.301)	-	(87.351)	-
Provisões para contingências	(3.598.114)	(2)	(4.698.940)	(3)
Valor adicionado líquido	145.893.861	95	138.035.626	95
Outras receitas	1.429.408	-	1.758.745	-
Receitas financeiras	7.567.023	5	6.783.580	5
Valor adicionado total a distribuir	<u>154.890.292</u>	<u>100</u>	<u>146.577.951</u>	<u>100</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO :				
Pessoal				
Remunerações	85.391.377	55	81.496.345	56
Encargos sociais (exceto previdência social)	8.996.607	6	9.136.431	6
Auxílio alimentação e outros benefícios	40.273.768	26	36.874.983	25
Total distribuído ao pessoal	134.661.752	87	127.507.759	87
Governo				
Previdência social sobre folha de pagamento	20.174.418	13	19.034.182	13
IRRF e IOF sobre aplicações financeiras	54.122	-	36.010	-
Total distribuído ao governo	20.228.540	13	19.070.192	13
Patrimônio líquido				
Superávit do exercício	-	-	-	-
Valor adicionado total distribuído	<u>154.890.292</u>	<u>100</u>	<u>146.577.951</u>	<u>100</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



ANEXO G

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício 2025

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em reais – centavos omitidos)

Nota 1 – Contexto Operacional

A Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Controle do Espaço Aéreo – CTCEA foi constituída por um grupo de associados fundadores em 12 de setembro de 2003 e de acordo com o Estatuto Social da CTCEA, sob a forma de associação civil de fins não econômicos e de direito privado, rege-se pelo presente Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

Tem por finalidade a realização de estudos, pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, projetos e programas científicos e tecnológicos no campo do controle do espaço aéreo e de defesa e preservação do meio ambiente e, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que venha a adquirir.

Em 08 de dezembro de 2003, a CTCEA foi qualificada pela Secretaria Nacional de Justiça como OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Uma OSCIP, por definição, é uma entidade do terceiro setor que se relaciona com o Poder Público Federal, Estadual, do Distrito Federal ou dos Municípios, visando à execução de atividades de interesse público por meio de um vínculo de cooperação que a lei denominou de “Termo de Parceria”, como definido nos requisitos da Lei n.º 9.790/1999, atualizada pela Lei n.º 13.019/2014.

A CTCEA, o Comando da Aeronáutica e o Comando do Exército, firmaram entre si, Termos de Parcerias e a seguir apresentamos as informações das Parcerias vigentes:

Em 6 de janeiro de 2021, a Organização e o Comando da Aeronáutica, representado pelo Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro – PAME firmaram entre si o Termo de Parceria nº. 001/PAME-RJ/CTCEA/2020 - Programa PAME-RJ, com prazo de 60 meses, tendo como objeto o desenvolvimento, a elaboração e a implementação de projetos de novos modelos produtivos e de sistemas alternativos de produção nas áreas de manutenção de equipamentos e sistemas, utilizados no controle do tráfego aéreo e na proteção ao voo, de suprimento técnico, de capacitação de pessoal e de impressão de publicações aeronáuticas, bem como a implementação de ações de logística sustentável e de promoção da preservação do meio ambiente, de forma a manter os níveis de disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos de proteção ao voo e dos sistemas de

tecnologia da informação operacional em padrões internacionais, bem como aumentar a eficiência e eficácia dos processos de manutenção e de publicações aeronáuticas. Registrado no PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR sob o nº 906702/2020.

Em 20 de dezembro de 2021, a Organização e o Comando do Exército, representado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia – DCT, e do Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (CMDO COM GE EX), firmaram entre si o Termo de Parceria nº. 21-EME-019-00 // Nº 001/CCOMGEX/CTCEA/2021, com prazo de 14 anos, tendo como objeto a cooperação técnica e especializada na gestão do Programa Estratégico do Exército – Sistema de Monitoramento de Fronteiras – SISFRON, mediante ações de colaboração, dentre outras, na gestão do ciclo de vida dos projetos, na elaboração dos novos requisitos dos sistemas e materiais, bem como nas fases de planejamento da contratação, seleção de empresas integradoras, empresas fornecedoras, gerenciamento e fiscalização de contratos administrativos e a formação de vínculo de cooperação, através do fornecimento de bens e serviços, realização de atividades, eventos, cooperação técnica e assessoria, conforme as diretrizes estabelecidas na Lei Federal n.º 9.790, de 23 de março de 1999 e no Decreto Federal n.º 3.100, de 30 de junho de 1999, no intuito de, em parceria com a Administração Pública, efetivar a preparação e a promoção das medidas necessárias ao apoio à implantação das fases do Projeto SAD, mantendo todas as atividades executadas em conformidade com a Estratégia Nacional de Defesa (END) e o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico e social do País, com reflexos diretos na defesa nacional, na proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Instrumento Jurídico e no Programa de Trabalho. Registrado no PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR sob o nº 921393/2021.

Em 31 de agosto de 2023, a Organização e o Comando da Aeronáutica, representado pela Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo – CISCEA, firmaram entre si o Termo de Parceria nº. 002/CISCEA/2023 – Programa CISCEA, com prazo de 60 meses, tendo como objeto a execução de estudos e pesquisas para o desenvolvimento, disponibilização e a implementação de tecnologias, bem como a gestão de projetos, no campo da navegação aérea, voltados à mobilidade de pessoas pelo modal aéreo, com significativos reflexos no desenvolvimento econômico e social do país, na preservação e proteção ao meio ambiente, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Instrumento Jurídico e no Programa de Trabalho. Registrado no PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR sob o nº 944500/2023.

Em 01 de setembro de 2023, a Organização e o Comando da Aeronáutica, representado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA firmaram entre si o Termo de Parceria nº 002/DECEA/CTCEA/2023 - Programa Tarifação, com prazo de 60 meses, tendo como objeto a realização de estudos, pesquisas, análises, proposições técnicas e administrativas, com a disponibilização de soluções para as áreas de interesse vinculadas à Gestão das Tarifas de Navegação Aérea e aos aspectos econômicos e financeiros dos serviços de navegação aérea. Registrado no PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR sob o nº 944518/2023.

Descrição	Valor Contratado (R\$)	Prazo de Execução dos Termos de Parceria	
		Início	Término
I) Termos de Parceria em Operação			
TP nº. 001/PAME/2020 - PROGRAMA PAME-RJ	131.944.702	Janeiro de 2021	Janeiro de 2026
TP nº. 001CCOMGEX/2021 - PROGRAMA SISFRON	617.826.572	Dezembro de 2021	Dezembro de 2035
TP nº002/CISCEA/2023 - PROGRAMA CISCEA	588.483.242	Setembro de 2023	Agosto de 2028
TP nº. 002/DECEA/2023 - PROGRAMA TARIFAÇÃO	97.044.457	Setembro de 2023	Agosto de 2028
Total Contratado	1.435.298.973		
II) Cronograma de Desembolsos			
ANO 2021	30.357.964		
ANO 2022	55.415.994		
ANO 2023	123.312.514		
ANO 2024	171.614.012		
ANO 2025	166.755.577		
ANO 2026	179.892.439		
ANO 2027	192.687.283		
ANO 2028	115.348.744		
ANO 2029	47.017.881		
ANO 2030	50.207.275		
ANO 2031	53.563.285		
ANO 2032	57.266.485		
ANO 2033	61.357.319		
ANO 2034	65.699.452		
ANO 2035	64.802.749		
Total Contratado	1.435.298.973		

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC e por Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1409/12 que aprova a ITG

(Interpretação Técnica Geral) 2002 – Entidade sem Finalidade Lucros e complementadas pelo NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas foram as seguintes:

- (a) Caixa e Equivalente de Caixa** – Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis considerados de liquidez imediata e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. Estão registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.
- (b) Almoxarifado** – Os materiais em almoxarifado estão avaliados pelo custo médio, não superando os preços correntes de mercado.
- (c) Demais Ativos Circulantes** – São demonstrados pelos valores realizáveis, acrescidos dos rendimentos e variações monetárias incorridos até a data do balanço e, quando aplicável, reduzidos por provisão para ajustar ao valor de mercado;
- (d) Imobilizado** – Avaliado ao custo de aquisição, reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas para redução no valor recuperável (“impairment”), quando aplicável. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear, para distribuir seu valor de custo ao longo da vida útil estimada. Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o valor de venda com o valor residual contábil, quando houver.

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

- (e) Intangível** – É registrado pelo valor do custo de aquisição, líquido de amortizações acumuladas.

A amortização é calculada pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens.

- (f) Passivo Circulante** – Os saldos são demonstrados pelos valores das obrigações conhecidas ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.

- (g) Contingências** – As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.
- (h) Férias a pagar** – Aplicando às normas estabelecidas, foi constituído um valor apurado para férias, de modo a refletir nos custos e/ou despesas operacionais os direitos trabalhistas devidos aos empregados até a data do balanço.
- (i) Instrumentos Financeiros** – Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Entidade se toma parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescidos dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros.
- (j) Apuração do Superávit/Déficit – Receitas e Despesas** – as receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência de exercícios.
- (k) Estimativas e Premissas Contábeis Críticas** – A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e, também, o exercício de julgamento por parte da administração da CTCEA no processo de aplicação das políticas contábeis.

As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e se baseiam na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros considerados razoáveis para as circunstâncias. Tais estimativas e premissas podem diferir dos resultados efetivos. Os efeitos decorrentes das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos no período da revisão.

Nota 4 – Caixa e Equivalente de Caixa

Estão representados pelos seguintes valores:

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Bancos Conta Movimento		
Banco Itaú S.A.	1.981	2.293
Banco do Brasil S.A.	40.618	7.607
Total de Numerário em Caixa / Bancos	42.599	9.900
Aplicações Financeiras		
Banco do Brasil S.A.	163.462.856	197.693.784
Total das Aplicações Financeiras	163.462.856	197.693.784
Total	163.505.455	197.703.684

Em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 os saldos de aplicações financeiras são representados, basicamente, por cotas de fundos de investimentos, administrados pela BB Administração de Ativos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e por aplicações em conta poupança em cumprimento a Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023, Art. 75, administrados pelo Banco do Brasil.

A taxa de administração destes fundos varia de 0% a 1% do patrimônio do fundo e sobre os rendimentos brutos é feita a retenção na fonte do imposto de renda que varia de 15% a 22,5%, de acordo com o prazo de permanência do investimento.

Parte significativa das aplicações financeiras foi efetuada em garantia dos valores apurados para cobrir Compromissos das Operações dos Termos de Parceria, podendo ser assim demonstradas:

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Contingências Trabalhistas	35.712.610	30.508.529
Contingências Fiscais	1.196.416	1.068.566
Recursos Compromissados para Operações do Termo de Parceria	125.175.937	164.876.408
Recursos institucionais	1.377.893	1.240.281
Institucional (Devolução de Depósito Judicial)	0	0
Total das Aplicações Financeiras	163.462.856	197.693.784

Nota 5 – Termos de Parceria a Faturar

O cronograma previsto para os recebimentos dos Termos de Parceria, em vigor, pode ser resumido como segue:

Períodos	Contratado	Recebido	Não Faturados até Dez 2025	A receber	
		2020 até 31 de Dez 2025		Curto prazo 2026	Longo prazo 2027 a 2031
2021	30.357.964	26.519.682	-	-	-
2022	55.415.994	61.776.711	-	-	-
2023	123.312.514	137.970.631	-	-	-
2024	171.614.012	242.224.914	-	-	-
2025	166.755.577	129.065.563	1.090.000,00	-	-
2026	179.892.439			128.700.999	-
2027	151.201.876				151.201.876
2028	115.348.744				115.348.744
2029	47.017.881				47.017.881
2030	50.207.275				50.207.275
2031	53.563.285				53.563.285
2032	57.266.485				57.266.485
2033	61.357.319				61.357.319
2034	65.699.452				65.699.452
2035	64.802.749				64.802.749
Totais	1.393.813.566	597.557.501	1.090.000	128.700.999	666.465.066
Total Geral			129.790.999		666.465.066

Nota 6 – Imobilizado Vinculado a Terceiros

O imobilizado em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, era composto como segue:

Descrição	Custo até 2024	2025				2024
		Adição	Baixa	Depreciação Acumulada	Valor Líquido	Valor Líquido
Móveis e Utensílios	292.465	39.057	(833)	(290.407)	40.281	4.888
Máquinas e Equipamentos	370.633	270.608	(13.880)	(270.724)	356.637	113.829
Computadores e Acessórios	512.628	129.373	(117.144)	(357.480)	167.376	75.551
Veículos	120.609	-	-	(114.776)	5.833	18.990
Edificações	1.026.097	-	-	(433.777)	592.320	606.001
Instalações	173.610	121.120	-	(182.694)	112.036	0
Total	2.496.042	560.158	(131.857)	(1.649.859)	1.274.483	819.258

Todos os bens patrimoniais foram adquiridos com os recursos provenientes dos Termos de Parcerias, os quais são mantidos sob a responsabilidade da CTCEA para utilização nas novas Parcerias firmadas com o mesmo Parceiro Público ou devolvidos nos casos de desgaste, obsolescência e encerramento da Parceria.

Com base nesse conceito, partir de 01/01/2017 foram realizados ajustes contábeis adotando como critério para reconhecimento destes bens patrimoniais como Imobilizado Vinculado a Terceiros, contabilizando como contra partida a conta de Obrigações com Terceiros

Imobilizado/Intangível de longo prazo, passivo não circulante, pelo valor equivalente ao montante líquido de seu imobilizado/intangível.

Havendo novas aquisições de bens, o saldo da conta de Obrigações com Terceiros Imobilizado/Intangível será aumentado e quando houver baixas o saldo será diminuído, a sua contrapartida será na conta de Recursos Projetos a Executar do Termo de Parceria e de Recursos de Provisões vinculados aos Termos de Parcerias.

Nota 7 – Intangível

O intangível em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, era composto como segue:

Descrição	Custo até 2024	2025				2024
		Adição	Baixa	Amortização Acumulada	Valor Líquido	Valor Líquido
Sistemas Aplicativos de Software	707.289	-	(9.312)	(697.977)	0	368
Total	707.289	-	(9.312)	(697.977)	0	368

Nota 8 – Provisões para Contingências

Em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, os saldos referiam-se a:

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Provisão para Compromissos de Passivo de Obrigações Trabalhistas	25.233.443	23.774.936
Total das Contingências	25.233.443	23.774.936

Visando cobrir compromissos de Passivo de Obrigações Trabalhistas, de sua responsabilidade, a CTCEA contabilizou esta Provisão nos termos da legislação trabalhista em vigor.

Nota 9 – Patrimônio Social

A CTCEA foi constituída em 12 de setembro de 2003, através de uma dotação inicial de seus associados fundadores no montante total de R\$ 2.000.

Nota 10 – Isenção de Tributos e Contribuições

Considerando que a CTCEA foi qualificada como OSCIP, os rendimentos decorrentes dos serviços por ela desenvolvidos de caráter científico, gozam de isenção em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e à contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), nos termos do artigo n.º 15 da Lei n.º 9.532 de 10 de dezembro de 1997.

Adicionalmente, as receitas das atividades próprias da Organização são isentas das contribuições para a seguridade social (COFINS) e para o programa de integração social (PIS), de acordo com o estabelecido no artigo n.º 46 do Decreto n.º 4.524 de 17 de dezembro de 2002.

As isenções usufruídas pela CTCEA no exercício de 2025, no montante de R\$ 16.012.743, estão apresentadas de acordo com a composição abaixo:

- a) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R\$ 13.156.416;
- b) Contribuição para Programa de Integração Social (PIS) = R\$ 2.856.327;
- c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R\$ 0,00;
- d) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) = R\$ 0,00.

Considerando que no exercício de 2024 não houve lucro líquido apurado, não haverá a incidência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ).

Nota 11 – Informações Sobre Seguros Contratados

O quadro a seguir apresenta o resumo dos Seguros, em vigor, em 31 de dezembro de 2025:

Descrição dos Seguros	Nº da Apólice	Prêmio Pago até 31 Dez 2024	Valor Segurado
Veículo GM Onix Sedan Plus - Placa LUS4D57 - ALLIANZ AUTO AUTOMOVEL	517720252N310287292	3.696	Tabela FIPE
Veículo SPIN LS 1.8 Ano 2021 - Placa RJG3F72 - ALLIANZ AUTO AUTOMOVEL	517720252N310965204	4.030	Tabela FIPE
Imóvel da CTCEA - Av. General Justo, 335/7º Andar - Bradesco Seguros	010272	2.590	4.221.600
Seguro de Vida (536 Vidas) - Unimed Seguradora S.A.	1.009.300.653.617	453.068	Valor por morte = 22 x Salário do empregado * coeficiente 0,00004454
Total		463.382	

Nota 12 – Rateio de Despesas da Administração Central entre Termos de Parceria

A partir de 01/06/2013, com a implementação do PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR nas parceiras da CTCEA, passou a vigorar o novo critério para alocação das despesas da Administração Central, o qual especifica por Parceria, a quantidade de empregados e suas respectivas despesas no apoio do desenvolvimento de cada Parceiro e através desta distribuição é apurado o rateio para alocação das despesas.

Apresentamos, a seguir, os percentuais médios com os montantes e a natureza dessas despesas, que foram apresentadas de forma consolidada na Demonstração do Superávit do exercício de 2025:

TERMOS DE PARCERIAS	TP 001 PAME/2020 31 Dez 2025	TP 001 CCOMGEX/2021 31 Dez 2025	TP 002 CISCEA/2023 31 Dez 2025	TP 002 DECEA/2023 31 Dez 2025	TOTAL ADM CENTRAL 31 Dez 2025
PERCENTUAL MÉDIO DE RATEIO:	16,347%	23,608%	51,544%	8,501%	100,000%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ADM. CENTRAL :					
DESPESAS COM PESSOAL	(2.254.514)	(3.255.957)	(7.108.846)	(1.172.377)	(13.791.694)
ENCARGOS SOCIAIS	(537.284)	(775.943)	(1.694.144)	(279.395)	(3.286.767)
DESPESAS GERAIS	(104.875)	(151.459)	(330.687)	(54.536)	(641.557)
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(276.233)	(398.934)	(871.007)	(143.645)	(1.689.818)
DESPESAS COM VIAGENS	(9.768)	(14.107)	(30.800)	(5.079)	(59.753)
DESPESAS COM DIÁRIAS	(4.432)	(6.400)	(13.974)	(2.305)	(27.110)
DEPRECIÇÃO	(5.607)	(8.098)	(17.680)	(2.916)	(34.301)
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	(1.855)	(2.679)	(5.849)	(965)	(11.347)
TOTAL DAS DESPESAS ADM	(3.194.568)	(4.613.577)	(10.072.986)	(1.661.217)	(19.542.347)



ANEXO H

Parecer e Relatório da Auditoria Independente

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício 2025

**ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO
CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO – CTCEA**

Rio de Janeiro – RJ

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO 2025
E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos

Administradores e Associados da

Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Controle do Espaço Aéreo – CTCEA

Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO - CTCEA**, que compreendem o balanço patrimonial em **31 de dezembro de 2025** e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nesta data, bem como, as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO - CTCEA**, em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a **ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO – CTCEA**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética profissional do contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com as normas. Acreditamos que a evidência da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício em 31 de dezembro de 2025, elaborada sob a responsabilidade da administração da Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Controle do Espaço Aéreo – CTCEA e apresentada como informação suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis do Termo de Parceria. Para formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente

elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessária, para permitir a elaboração de demonstrações contábeis, livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da **ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO - CTCEA**, continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil, na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que, a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não teria nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da **ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO - CTCEA**, são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante, resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria, para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da **ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO - CTCEA**.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições, que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da **ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO - CTCEA**. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria, para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria, obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a **ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO - CTCEA**, a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive, as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2026.

DocuSigned by:
Jorge Luiz Calaza Rocha

66D90A662A12406...

JORGE LUIZ CALAZA ROCHA
CONTADOR - CRC - RJ nº 62.580/0-1
GLOBAL AUDITORES INDEPENDENTES
CRC - DF nº 000810/0 - F - RJ



ANEXO I

Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício 2025



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ORGANIZACAO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E
TECNOLOGICO DO CONTROLE DO ESPACO AEREO-CTCEA**
CNPJ: 05.979.994/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:02:47 do dia 19/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2026.

Código de controle da certidão: **E234.40FF.54D9.14D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ANEXO J

Certificado de Regularidade do FGTS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício 2025

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.979.994/0001-53
Razão Social: ORGANIZACAO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFIC
Endereço: AV GENERAL JUSTO 335 7 ANDAR / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20021-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013003451258552117

Informação obtida em 03/02/2026 09:41:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ANEXO K

Extratos de Relatórios de Execução Física e Financeira

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício 2025

Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Controle do Espaço Aéreo			
Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira do Termo de Parceria nº. 21-EME-019-00 // 001/CCOMGEX/2021 – Programa SISFRON			
Custo do Projeto: R\$ 617.826.572,00			
Local de realização do projeto: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO, RODOVIA DF-001, KM 05 – SETOR HABITACIONAL TAQUARI – LAGO NORTE			
Data de assinatura do Termo de Parceria: 20/12/2021			
Início do Projeto: 20/12/2021		Término: 19/12/2035	
Objetivos do projeto: A cooperação técnica e especializada na gestão do Programa Estratégico do Exército – Sistema de Monitoramento de Fronteiras – SISFRON, mediante ações de colaboração, dentre outras, na gestão do ciclo de vida dos projetos, na elaboração dos novos requisitos dos sistemas e materiais, bem como nas fases de planejamento da contratação, seleção de empresas integradoras, empresas fornecedoras, gerenciamento e fiscalização de contratos administrativos e a formação de vínculo de cooperação, através do fornecimento de bens e serviços, realização de atividades, eventos, cooperação técnica e assessoria.			
Resultados alcançados: O Relatório Anual de Execução de Atividades posição 31 de dezembro de 2025, baseado na sistemática de avaliação estabelecida para obtenção do índice de desempenho da execução física, constante no item 8 daquele documento, considerou que a Organização cumpriu satisfatoriamente as metas previstas para o período.			
Custos de Implementação do Projeto de 20 de Dezembro de 2021 a 19 de Dezembro de 2035			
Categories de despesa	Previsto	Realizado	Diferença
Cooperação técnica e especializada na gestão do SISFRON, mediante ações de colaboração, dentre outras.		2021 / 2022 / 2023 2024 / 2025	
2021 a 2035 - Natureza da Despesa 3.3.90.30 / 3.3.90.39 / 4.4.90.39 / 4.4.90.51 / 4.4.90.52	617.826.572,00	106.626.374,00	511.200.198,00
Nome da OSCIP: ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO - CTCEA			
Endereço: Avenida General Justo, n.º 335 – 7º andar – Centro			
Cidade: Rio de Janeiro	UF: RJ	CEP: 20021-130	
Tel.: (21) 2111-1000		E-mail: cedoc@ctcea.org.br	
Nome do responsável pelo projeto: Luis Augusto Bordallo			
Cargo/Função: Diretor-Geral			

Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Controle do Espaço Aéreo			
Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira do Termo de Parceria nº. 001/PAME-RJ/CTCEA/2020 – Programa PAME-RJ			
Custo do Projeto: R\$ 131.944.702,00			
Local de realização do projeto: RUA GENERAL GURJÃO, n.º 04 - CAJU			
Data de assinatura do Termo de Parceria: 22/12/2020			
Início do Projeto: 06/01/2021 Término: 05/01/2026			
Objetivos do projeto: O desenvolvimento, a elaboração e a implementação de projetos de novos modelos produtivos e de sistemas alternativos de produção nas áreas de manutenção de equipamentos e sistemas, utilizados no controle do tráfego aéreo e na proteção ao voo, de suprimento técnico, de capacitação de pessoal e de impressão de publicações aeronáuticas, bem como a implementação de ações logísticas sustentáveis e de promoção da preservação do meio ambiente, de forma a manter os níveis de disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos de proteção ao voo e dos sistemas de tecnologia da informação operacional em padrões internacionais, bem como aumentar a eficiência e a eficácia dos processos de manutenção e de publicações aeronáuticas.			
Resultados alcançados: O Relatório Anual de Execução de Atividades posição 31 de dezembro de 2025, baseado na sistemática de avaliação estabelecida para obtenção do índice de desempenho da execução física, constante no item 6 daquele documento, considerou que a Organização cumpriu satisfatoriamente as metas previstas para o período.			
Custos de Implementação do Projeto de 06 de Janeiro de 2021 a 05 de Janeiro de 2026			
Categories de despesa	Previsto	Realizado	Diferença
Desenvolvimento, elaboração e implementação de projetos de modelos produtivos e sistemas alternativos de produção, nas áreas de controle do espaço aéreo e de meio ambiente.		2021 / 2022 / 2023 2024 / 2025	
2021 a 2026 - Natureza da Despesa 3.3.50.41	131.944.702,00	131.944.702,00	0,00
Nome da OSCIP: ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO - CTCEA			
Endereço: Avenida General Justo, n.º 335 – 7º andar – Centro			
Cidade: Rio de Janeiro	UF: RJ	CEP: 20021-130	
Tel.: (21) 2111-1000		E-mail: cedoc@ctcea.org.br	
Nome do responsável pelo projeto: Luis Augusto Bordallo			
Cargo/Função: Diretor-Geral			

Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Controle do Espaço Aéreo			
Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira do Termo de Parceria nº. 002/CISCEA/2023 – Programa CISCEA			
Custo do Projeto: R\$ 588.483.242,00			
Local de realização do projeto: AV. GENERAL JUSTO, n.º 160 – PRÉDIO CISCEA			
Data de assinatura do Termo de Parceria: 31/08/2023			
Início do Projeto: 31/08/2023		Término: 30/08/2028	
Objetivos do projeto: Execução de estudos e pesquisas para o desenvolvimento, disponibilização e a implementação de tecnologias, bem como a gestão de projetos, no campo da navegação aérea, voltados à mobilidade de pessoas pelo modal aéreo, com significativos reflexos no desenvolvimento econômico e social do país, na preservação e proteção ao meio ambiente.			
Resultados alcançados: O Relatório Anual de Execução de Atividades posição 31 de dezembro de 2025, baseado na sistemática de avaliação estabelecida para obtenção do índice de desempenho da execução física, constante no item 7 daquele documento, considerou que a Organização cumpriu satisfatoriamente as metas previstas para o período.			
Custos de Implementação do Projeto de 31 de Agosto de 2023 a 30 de Agosto de 2028			
Categories de despesa	Previsto	Realizado	Diferença
Execução de estudos e pesquisas para o desenvolvimento, disponibilização e a implementação de tecnologias, bem como a gestão de projetos, no campo da navegação aérea e meio ambiente.		2023 / 2024	
2023 a 2028 - Natureza da Despesa 3.3.50.41	588.483.242,00	311.413.940,00	277.069.302,00
Nome da OSCIP: ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO - CTCEA			
Endereço: Avenida General Justo, n.º 335 – 7º andar – Centro			
Cidade: Rio de Janeiro	UF: RJ	CEP: 20021-130	
Tel.: (21) 2111-1000		E-mail: cedoc@ctcea.org.br	
Nome do responsável pelo projeto: Luis Augusto Bordallo			
Cargo/Função: Diretor-Geral			
